



T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

DOKAP EYLEM PLANI 2016 YILI İLERLEME RAPORU

2016

ŞUBAT 2017

DOKAP Eylem Planı (2014-2018)



İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	4
1. DOĞU KARADENİZ PROJESİ	6
2. DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (DOKAP BKİ)	7
2.1. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Görevleri	7
2.2. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Organizasyon Şeması	8
3. DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)	8
3.1. DOKAP Eylem Planı Bütçesi	9
3.2. DOKAP Eylem Planı İle Belirlenen Hedefler	10
3.2.1. Turizm	10
3.2.2. Çevresel Sürdürülebilirlik	10
3.2.3. Tarım	10
3.2.4. Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge.....	11
3.2.5. Madencilik.....	11
3.2.6. Ulaştırma ve Bilgi İletişim.....	11
3.2.7. Tarımsal ve Kırsal Altyapı.....	12
3.2.8. Enerji.....	12
3.2.9. Kentsel Gelişme.....	12
3.2.10. Eğitim	13
3.2.11. Sağlık.....	13
3.2.12. Sosyal Hizmetler ve Destekler	13
3.2.13. Kültür ve Spor	14
3.2.14. Yerelde Düzeyde Kurumsal Kapasite	14
3.3. DOKAP Eylem Planı 2016 Yılı Gerçekleşme Bilgileri	15
3.3.1. Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri	15
3.3.2. Eylemlere Göre Gerçekleşme Bilgileri.....	16
3.3.2.1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik	16
3.3.2.2. Ekonomik Kalkınma	18
3.3.2.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme.....	21
3.3.2.4. Sosyal Gelişme	24
3.3.2.5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	27
3.3.3. Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri	29
3.3.4. Yapılan Harcamaların İllere Göre Dağılımı.....	35
3.4. DOKAP Eylem Planı Kapsamında Yapılan Faaliyetler	39
3.4.1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik	40
3.4.2. Ekonomik Kalkınma	43
3.4.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme.....	49
3.4.4. Sosyal Gelişme	56
3.4.5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	60

ÖNSÖZ



DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 642 sayılı kuruluş KHK'sı gereğince, DOKAP Bölgesi'nde yatırımlarda bulunan kurum ve kuruluşların DOKAP Eylem Planı (2014-2018) kapsamında yürüttükleri kamu yatırımlarını, uyguladıkları mali destek programlarını ve gerçekleştirdikleri faaliyetleri izleyip değerlendirmektedir.

DOKAP Eylem Planı'nın başlangıç yılı olan 2014 yılından bu zamana kadar geçen 3 yıl içinde (2014-2016) DOKAP Eylem Planı'nda yer alan sorumlu kuruluşlar tarafından 8,9 milyar TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımız DOKAP Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirilmesine devam ederken, Bölge kalkınmasına hizmet vermek amacıyla başta tarım ve turizm olmak üzere çeşitli alanlarda uygulamalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede 2016 yılında DOKAP Eylem Planı kapsamında 76,7 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında ise 123 milyon TL harcama yapılması öngörülmektedir.

Çalışmalarımız büyük bir özveriyle, eylem planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda sürdürülerek, '*Bölgeyi ihracat ve turizm merkezi haline getirmek.*' vizyonuna ulaşılacaktır. DOKAP Eylem Planı İlerleme Raporunun hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.

Ekrem YÜCE
Başkan



1. DOĞU KARADENİZ PROJESİ

Türkiye Cumhuriyeti, ülke kaynaklarının, kalkınma çabalarında doğru kullanılmasını temin etmek, yerel dinamikleri ve fırsatları doğru kullanabilmek, yöre insanının kalkınma çabaları içerisinde yer alması ve entegrasyonunu sağlamak amacıyla, planlı kalkınma dönemi boyunca bölgesel kalkınma faaliyetlerine atıfta bulunmuş ve her dönemde bir veya birkaç bölgesel kalkınma projesi/programı yürütmeye çalışmıştır.

Ülkemizde bölgesel kalkınma programları, 1950'lerde başlamıştır. Planlı kalkınma döneminde hazırlanan tüm 5 yıllık Kalkınma Planları bölgesel kalkınma ile ilgili hükümler içermiştir. Uygulamaya konan bu programların ilk örneği Marmara Bölgesi Kalkınma Projesi'dir. Hızlı kalkınma sonucunda oluşan sosyo-ekonomik problemlerin çözümünü amaçlayan Marmara Bölgesi Kalkınma Projesi, ilk 5 Yıllık Kalkınma Planı döneminde uygulanmıştır. Bir diğer örnek olan Zonguldak Bölgesel Kalkınma Projesi ise büyük sanayi kuruluşlarının yeniden yapılanmasını desteklemek üzere bölgeye yapılacak altyapı yatırımlarını geliştirmeyi amaçlamıştır.

Bölgesel gelişme politikalarının ulusal düzeyde öncelik ve hedeflerini belirlemek amacıyla hazırlanan "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)" belgesinin vizyonu "Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye" olarak belirlenmekte ve bu vizyona ulaşmak için refahın ülke sathına daha dengeli yayılması; tüm bölgelerin potansiyellerinin değerlendirilerek rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması; ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi ile ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni ve mekânsal gelişmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde, bölgelerin ve bölgelerdeki farklı nitelikteki yerleşimlerin kaynak ve potansiyellerinin en verimli şekilde değerlendirilmesi, yerleşme sisteminin etkinleştirilerek daha dengeli bir yapıya kavuşturulması, yerleşmeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve mekâna duyarlı kalkınma politikalarının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu kapsamda, Anadolu'da mevcut metropol kentleri dengeleyecek yeni alt merkezlerin oluşturulması ve bölgelerin ve yerleşimlerin ulusal kalkınmada sahip oldukları roller dikkate alınarak bunlara özgü politikaların geliştirilmesi yoluyla kalkınmanın ülke geneline yayılmasının gerekliliğine işaret edilmektedir.

Türkiye ekonomisi geliştikçe, devlet yönetiminin kalkınma politikaları ülkenin az gelişmiş bölgelerine odaklanmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), bu yeni yaklaşımı temsil eden ilk bölgesel kalkınma projesidir. GAP ile birlikte, bölgesel kalkınma politikaları artan bir ivmeyle önem kazanmaya başlamıştır. Orta Vadeli Plan ile 10. Kalkınma Planı, bölgelerarası gelir farklarını azaltmayı hedefleyen bir politikayı daha açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Bu politikanın amacı sosyal, ekonomik, kültürel ve politik açılardan ulusal bütünlüğü güçlendirmektir. Bu amaca erişilmesi, ulusal büyümeye katkıda bulunabilecek olan bölgelerin kalkınma potansiyellerinin değerlendirilmesi ile mümkündür.

Türkiye'nin her bölgesinin tamamlayıcılık, entegrasyon ve işbirliğini güçlendirmek; genel ekonomi içerisindeki rol ve fonksiyonunu artırmak, bölgesel ve küresel etkinliğini geliştirmek devletimizin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel gelişme ve kalkınma projelerinin amacı, Türkiye ölçeğinde bölgesel ve bölge içi sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikleri gidererek, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü sağlam temeller üzerinde inşa etmektir.

Türkiye, yakın döneme kadar bölgesel ve bölge içi sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikler nedeniyle makro ölçekte iyi tasarlanmış kalkınma politikalarının istenilen baz etkiyi oluşturamadığını gözlemlemiştir. Bu kapsamda bölgesel farklılıkları azaltma ve bölgesel gelişim politikalarının başarıya ulaşması için GAP Bölge Kalkınma İdaresine ilave olarak üç bölgede Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları (DAP, KOP ve DOKAP) kurulmuştur.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanların gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeler arası ve bölge içi farklılıkları gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir.

2. DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (DOKAP BKİ)

Doğu Karadeniz Projesi uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projesinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle projenin kapsadığı bölgenin kalkınmasını hızlandırmak üzere 08.06.2011 tarihinde Resmi Gazete 'de yayınlanan 642 sayılı KHK gereğince Merkezi Giresun ili olan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) kurulmuştur.

DOKAP BKİ Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsayan 58.923 km²'lik bir alanda, bölgede yaşayan 4.634.327(2016) vatandaşımızın, yaşam kalitesini yükseltmek, sınırlı olan istihdam imkânlarını artırmak, sahip olduğu doğal kaynakları dengeli ve bozulmadan kullanmak, eksik kamu hizmetlerini ve yatırımlarını hızlıca tamamlamak ve bölge insanının sosyo-ekonomik seviyesini yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.


2.1. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Görevleri

- ✓ Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak bölgede yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı'na göndererek mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak,
- ✓ Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- ✓ İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak,

- ✓ Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,
- ✓ Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
- ✓ Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak,
- ✓ Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

olarak belirlenmiştir.

2.2. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Organizasyon Şeması

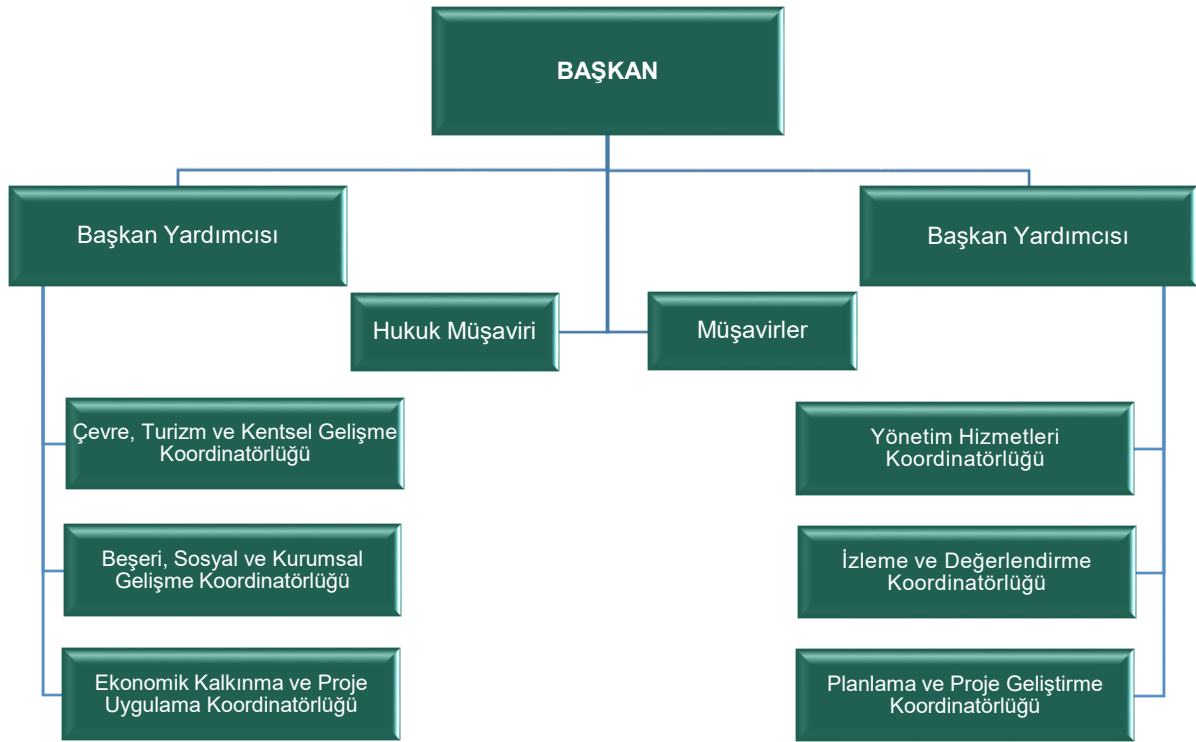

3. DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

Kurumumuz ilk olarak 642 sayılı KHK gereğince DOKAP Eylem Planı çalışmalarını başlatmıştır. 2014-2018 yılları arasında kapsayacak olan DOKAP Eylem Planının hazırlık sürecinde; insan odaklı sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve yeni bölgesel gelişim yaklaşımları baz alınmıştır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı hazırlık sürecinde DOKAP Bölgesi için yapılmış tüm çalışmalar dikkate alınarak bu çalışmaların iz düşümlerinin DOKAP Eylem Planı'nda yer alması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çabaların temel amacı, Bölgesel Kalkınmanın

yerel ayağını oluşturan dinamikler ile bölgesel kalkınmanın merkezi yönetim ayağını oluşturan kurum ve kuruluşlar arasında dinamik ve etkin bir süreç tasarlamaktır.

DOKAP Eylem Planı hazırlık sürecinde öncelikle mevcut veriler üzerinden durum analizleri ortaya çıkarılmıştır. Akabinde ortaya çıkan sonuç doğrultusunda bölge ile ilgili sorun, paydaş, hedef ve strateji analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan bütün çalışmalarda katılımcılık genel ilke olarak belirlenmiştir. Çalışmanın birinci ayağını il toplantıları, ikinci ayağını bölgeden yüksek katılımın sağlandığı sektör çalıştayları, üçüncü ayağını çalıştaylardan elde edilen sonuçların sunulduğu Bakanlık merkez teşkilatlarıyla yapılan görüşmeler oluşturmuştur. DOKAP Eylem Planı gerçekleştirilen son revizyonların akabinde, **30.12.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nda onaylanmış ve 14.02.2015 tarihinde dönemin Başbakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU** tarafından Ordu ilinde kamuoyuna açıklanmasıyla faaliyetlerine başlamıştır.

2014-2018 yılları arasında 9 ilde uygulanması hedeflenen (Tokat ili 2016 yılında DOKAP kapsamına alındığından dolayı, Tokat ili ilgili projeler DOKAP Eylem Planı kapsamında 2017 yılından itibaren değerlendirilecektir.) DOKAP Eylem Planı kapsamında:

- Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik
- Ekonomik Kalkınma
- Altyapı ve Kentsel Gelişme
- Sosyal Gelişme
- Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

olmak üzere **5** ana eksen, **20** alt eksen, **128** ana eylem ve **325** alt eylem tasarlanmıştır.

3.1. DOKAP Eylem Planı Bütçesi

Milyon TL

EKSENLER	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik	87	98	123	138	149	595
Ekonomik Kalkınma	85	95	120	134	145	579
Altyapı ve Kentsel Gelişme	1.030	1.151	1.456	1.626	1.761	7.024
Sosyal Gelişme	314	351	444	496	537	2.142
Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	4	5	6	7	7	29
TOPLAM	1.520	1.700	2.149	2.401	2.599	10.369

Not: Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilecek yatırım ödeneklerini göstermekte olup; diğer kaynaklardan sağlanacak ilave finansman dâhil değildir. Ayrıca, projelerin gerçekleşme durumuna göre ve bütçe imkânlarına bağlı olarak ilave kaynak tahsis edilebilecektir.

3.2. DOKAP Eylem Planı İle Belirlenen Hedefler

3.2.1. Turizm

DOKAP Bölgesi'nin lokomotif sektörüdür. Sürekli olarak ve hızlıca gelişmektedir. Gelişimin sürdürülebilir kılınması, doğa ile dost işletmelerin ve turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve sektörün 12 ay boyunca aktif olması için, DOKAP Eylem Planı ile

- Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında Samsun Havaalanı'ndan başlayıp Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren Yeşil Yol güzergâhının yolcu ve araç güvenliğinin sağlanarak turizme kazandırılması,
- Yeşil Yol güzergâhı üzerinde bulunacak olan turizm yatırımlarının desteklenmesi,
- Turizm Merkezlerinin İmar Planlamalarının yapılması,
- Bölge yaylalarının karakteristiğini yansıtan binaların planlanarak uygulamalarının yapılması,
- Bölgenin bilinirliğini artırmak amacıyla etkin tanıtımının yapılması,
- Bölgedeki kültür varlıklarının korunarak, geliştirilmesi ve turizme kazandırılması,
- Doğu Karadeniz Bölgesinde Yat ve Kurvaziyer Turizminin cazip hale getirilmesi,
- Bölgenin, turizminin gelişimine bağlı olarak ihtiyaç duyulacak olan nitelikli işgücü kapasitesinin oluşturulması,

hedeflenmektedir.

3.2.2. Çevresel Sürdürülebilirlik

DOKAP Bölgesi sahip olduğu zengin doğal kaynaklar neticesinde etkili bir çevre yönetimi sistemine ihtiyaç duymaktadır. Özellikle günümüz dünyasında çevre kirliliğinin artış göstermesi ve buna bağlı olarak doğal kaynakların kontrolsüz olarak tüketilmesi çevre kaynaklarının korunmasını stratejik bir alana taşımıştır. DOKAP Eylem Planı koruma-kullanma dengesi dâhilinde, etkin bir çevre yönetim sisteminin hayata geçirmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Milli Park Projelerinin tamamlanması,
- Biyokaçakçılıkla ilgili etkin mücadelenin sürdürülmesi,
- Bölge genelinde doğal hayatın korunması sağlanarak biyolojik çeşitliliğin tespitinin yapılması,
- DOKAP Bölgesinde deniz kirliliği ile ilgili gerekli tespitlerin yapılması,
- Bölge genelinde tarımsal kirliliğin izlenmesi ve azaltılması ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi,

hedeflenmektedir.

3.2.3. Tarım

DOKAP Bölgesinin rekabet gücü en yüksek sektörü, tarım sektörüdür. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bitkisel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi,
- Sertifikalı üretimin teşvik edilmesi,
- Doğayla dost tarımsal üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması,
- Bölgedeki potansiyel organik havzaların tespitlerinin yapılması,
- Örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması,
- Çay ve fındık üretiminde kalitenin artırılması,
- Meraların ıslahı ve sürdürülebilir kullanım imkânlarının belirlenmesi,

- Bölge hayvancılığının desteklenmesi,
 - Hayvancılıkta örnek üretim sistemlerinin geliştirilmesi,
 - Bölgede Soğuk Hava Depolama kapasitesinin artırılması,
 - Lisanslı Depoculuğun yaygınlaştırılması,
 - Orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanım imkânlarının sağlanması,
 - Tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmesi,
- hedeflenmektedir.

3.2.4. Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge

DOKAP Bölgesi bulunduğu konum ve sahip olduğu potansiyeller gereği sanayi konusunda gelişmeyi amaç edinmiştir. Özellikle coğrafi konumu gereği geliştirmeyi hedeflediği dış ticaret konusunda bölge içinde var olacak olan gelişmiş sanayi ve ticaret kapasitesinin önemli katkılar sunacağı aşikârdır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge içerisinde kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi,
 - Bölge ihracatının geliştirilmesi,
 - Bölgede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 - Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin tamamlanması,
 - Bölgenin ulaşım ağlarının kesim noktaları ile İç Anadolu, GAP ve DAP ile olan bağlantı noktalarına Lojistik Merkezlerin kurulması,
 - Tarım ve orman ürünlerine dayalı sanayi ile ilgili yatırım potansiyellerinin araştırılması,
 - Doğu Karadeniz Yatırım Platformunun kurulması,
 - Bölge genelinde var olan üniversitelerin ve enstitülerin araştırma altyapılarının iyileştirilerek geliştirilmesi,
 - Bölgede genelinde teknolojik gelişme ve Ar-Ge çalışmaları için gerekli altyapıların sağlanması,
- hedeflenmektedir.

3.2.5. Madencilik

DOKAP Eylem Planı madencilik ile ilgili, bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyellerinin tespit edilerek, çevresel konularda azami hassasiyet gösterilmesi suretiyle kaynakların ekonomiye kazandırılmasını hedeflemektedir.

3.2.6. Ulaştırma ve Bilgi İletişim

Bölge vizyonuna ulaşabilmek için ulaşım altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge içi ve bölgeye ulaşımın kalitesi artırılması ve çeşitlendirilmesi,
 - Bölge limanlarının etkin kullanım stratejilerinin belirlenmesi,
 - Bölge içerisindeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) fiber altyapılarının yaygınlaşmasının sağlanması
 - Ulaşım ağlarının birbirleriyle entegre edilmesi,
 - Ulaştırma altyapı eksiklikleri tamamlanması,
 - Bölgenin İç Anadolu, DAP ve GAP bölgeleri ile olan bağlantıların güçlendirilmesi
- hedeflenmektedir.

3.2.7. Tarımsal ve Kırsal Altyapı

Bilindiği üzere DOKAP Bölgesi oldukça zengin su kaynaklarına sahiptir. Bununla birlikte yıl içi aldığı yoğun yağış miktarı bölge genelinde taşkın riskini artıran en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sahip olunan zengin su kaynaklarının özellikle tarım alanlarında etkili bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge genelinde ıslah ve taşkın koruma faaliyetlerinin hızlandırılması,
 - Basınçlı sulama sistemleri ve etkin su kullanımı konusunda çiftçi ve teknik eleman eğitimlerinin yapılması,
 - Sulama altyapısının geliştirilmesi,
 - AT ve TİGH çalışmalarının tamamlanması,
 - KÖYDES projesi kapsamında kırsal altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulması,
- hedeflenmektedir.

3.2.8. Enerji

DOKAP Bölgesi sahip olduğu doğal kaynaklar nedeni ile yenilenebilir enerji konusunda da önemli potansiyele sahiptir. Sahip olunan bu potansiyelin gerekli araştırmaların yapılarak kullanıma kazandırılması, ülke olarak sorun yaşadığımız enerji açığı sorununun çözümü için önemli katkılar sağlayacaktır. Bununla birlikte bölge genelinde enerji alt yapısının iyileştirilmesi, sanayi ve diğer iş kollarının gelişiminde de başat etki sağlayacaktır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölgenin enerji üretim altyapısının iyileştirilmesi,
 - Bölgenin enerji dağıtım altyapısının iyileştirilmesi,
 - Bölge genelinde eksik kalan doğalgaz iletim hatlarının tamamlanması,
 - Bölgede yenilenebilir enerji çalışmalarının desteklenmesi,
- hedeflenmektedir.

3.2.9. Kentsel Gelişme

DOKAP Bölgesi genelinde coğrafi şartlar nedeni ile kentleşme alanında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Arazi stokunda yaşanan sıkıntılar yeni kentsel alanların üretiminde büyük zorluklara neden olmaktadır. Ayrıca kentsel alanlar kıyı kesiminde şeritvari şekilde dağılım göstermekte, mevcut kentsel alanlardaki çarpık yapılaşma ve dere yataklarına yapılan kontrolsüz yapılaşmalar olası sel felaketlerinde, acı tabloların yaşanmasına neden olmaktadır. Bilindiği üzere yaşanabilir mekânsal yapıların oluşturulması bölge içinden dışarıya gerçekleşen nitelikli göçün önlenmesinde, bununla birlikte bölge kalkınmasında önemli bir parametre olan nitelikli insan kaynağının bölge içine çekilmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri çalışmalarının tamamlanması,
 - Şehirlerdeki rekreasyon alanlarının artırılması,
 - Bölge genelinde kanalizasyon ve içme suyu altyapıları ile arıtma sistemlerinin tamamlanması,
 - Kırsal kesimde oluşan evsel atıkların toplanması,
 - Entegre Katı Atık Yönetim projelerinin tamamlanması,
 - Düzenli depolama alanları için yer tespiti çalışması ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırılması,
- hedeflenmektedir.

3.2.10. Eğitim

DOKAP Eylem Planı dezavantajlı gruplardan normal bireylere kadar toplumun hemen hemen her kesimini kapsayan ilerleme modellerini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge genelinde okulöncesi eğitim alanında fiziki altyapının iyileştirilerek okullaşma oranlarının artırılması,
 - Bölge genelinde ilköğretim ve ortaöğretim alanlarında fiziki altyapıların geliştirilmesi,
 - Zenginleştirilmiş kütüphanelerin bölge geneline yaygınlaştırılması,
 - Kültür hizmetlerine erişimin artırılarak, okuma kültürünün geliştirilmesi,
 - Rehberlik Araştırma Merkezlerinin yaygınlaştırılarak kapasitelerinin artırılması,
 - Bölge genelinde yükseköğretim altyapısının geliştirilmesi,
 - Bölge üniversitelerinin öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanması,
 - Sürekli Eğitim Merkezlerinin geliştirilmesi ve toplumun her kesimi için hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin geliştirilmesi,
 - Bölge genelinde yurt kapasitelerinin artırılması,
 - Yerel yönetimler bünyesinde Kamu Bilişim Merkezleri kurulması,
- hedeflenmektedir.

3.2.11. Sağlık

DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge genelinde koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
 - Bölgenin sağlık alanında fiziki ve beşeri altyapısının geliştirilmesi,
 - Bölgenin sağlık turizminde önemli bir merkez haline getirilmesi,
- hedeflenmektedir.

3.2.12. Sosyal Hizmetler ve Destekler

DOKAP Bölgesi'nde yaşayanların ihtiyaç duyacağı sosyal hizmetlerin erişilebilirliği, kalitesinin artırılması ve ihtiyaca cevap verecek hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge içi koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışman odaklı sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması,
 - Engellilere yönelik eğitim ve istihdam hizmetlerinin niteliğinin artırılması,
 - Engelli bireylerin hizmetlere ulaşımı, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması,
 - Bölge genelinde Sevgi Evlerinin yaygınlaştırılarak niteliklerinin artırılması,
 - Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmelerinin sağlanması,
 - Bölgede yaşayan yaşlılara yerinde hizmet, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin günün şartlarına uygun hale getirilerek erişilebilirliklerinin artırılması,
 - Bölge genelinde Sosyal İçerme Projelerinin uygulanması,
 - Bölge illerinde sosyal analiz çalışmalarının yapılması,
 - DOKAP Bölgesinde Gençlik Merkezlerinin yaygınlaştırılması,
- hedeflenmektedir.

3.2.13. Kültür ve Spor

- Bölgenin Kültür Varlıkları Envanterinin çıkarılması,
- Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve restorasyon işlerinin tamamlanması,
- Etnografya müzesi olmayan illerde yeni müzelerin yapılması,
- Kültür hizmetlerine erişimin artırılması,
- Bölge genelinde spor altyapısının geliştirilmesi,

hedeflenmektedir.

3.2.14. Yerelde Düzeyde Kurumsal Kapasite

Bölgesel ve ulusal kalkınma yaklaşımlarında insan faktörü büyük önem arz etmektedir. Gerek kamusal alanda gerekse de özel sektör alanında nitelikli insan kaynaklarının varlığı gelişmiş toplumların en önemli göstergeleri niteliğindedir. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı ile

- Bölge genelindeki il müdürlüklerinin eğitim ihtiyaçlarının analiz edilerek, gerekli görülen alanlarda eğitim programlarının düzenlenmesi,
- Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilerek, gerekli görülen alanlarda eğitim programlarının düzenlenmesi,
- Büyükşehir belediyelerinin kırsal alana hizmet sunumlarının etkinleştirilmesi amaçlı örgütlenme çalışmalarının desteklenmesi,
- Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik desteklerin sağlanması,
- Kalkınma ajansları için çeşitli alanlarda eğitimlerin düzenlenmesi,
- DOKAP BKİ'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi,
- Bölgedeki STK'ların fiziki, kurumsal ve beşeri gelişimlerinin desteklenmesi,
- Bölge üniversitelerinde çalışan personelin eğitim ihtiyaç analizi yapılarak ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitimlerin sağlanması,
- Tarım ve Kredi Kooperatifleri, FİSKOBİRLİK ve çiftçi örgütlerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilerek, gerekli görülen alanlarda eğitim programlarının düzenlenmesi,
- Yerel yönetimler, merkezi idarelerin taşra teşkilatları, STK'lar, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kurumsal yetkinlik analizi gerçekleştirilerek, tespit edilen kurumsal ve beşeri eksikliklerin giderilmesi,

hedeflenmektedir.

Tablo: DOKAP Eylem Planı'nın Katkısıyla Bölgede Ulaşılmaması Öngörülen Makro Hedefler

Gösterge	Bölge	Mevcut Durum	2018 yılı Hedefi
Kişi başı GSKD değerinin Türkiye ortalamasına oranı (%)	TR83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)	73,2 (2011)	76,9
	TR 90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon)	72,0 (2011)	74,5
	TRA1 (Erzurum, Erzincan ve Bayburt)	63,8 (2011)	69,9
İşsizlik Oranı *	DOKAP Bölgesi	6,7 (2013)	4,7
İstihdam Oranı *	DOKAP Bölgesi	47,6 (2013)	51,1
İşgücüne Katılma Oranı *	DOKAP Bölgesi	51,0 (2013)	53,7
İhracat Değeri (bin dolar)	DOKAP Bölgesi	2.431.689 (2013)	2.728.392


* İşgücüne katılım, istihdam ve işsizlik tahminlerinde, illerin bölge işgücü piyasası içindeki göreceli değerleri nüfusları ile ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Bölgenin işgücü piyasası gelişiminin Kalkınma Planının 2018 yılı hedefleri ile uyumlu şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede bölgede işsizliğin 2018 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 2 yüzde puanı düşmesi beklenmektedir. İşgücüne katılım ve istihdam oranlarının da sırasıyla 3,8 ve 4,5 yüzde puanı artması beklenmektedir.

3.3. DOKAP Eylem Planı 2016 Yılı Gerçekleşme Bilgileri

3.3.1. Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri

2016 yılında DOKAP Eylem Planı kapsamında uygulaması olan 89 eylem kapsamında 783 proje faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda 2016 yılında tahsis edilen 4.376.595.450,01 TL ödenekten, 3.659.366.842,95 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Eksen bazında en fazla harcama 286 proje altında 2.565.579.831,97 TL ile Altyapı ve Kentsel Gelişme ekseninde, en az harcama ise 3 proje altında 141.150 TL ile Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde gerçekleşmiştir. DOKAP Eylem Planı'nın eksenlere göre proje sayısı ve harcama bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Grafik 1: DOKAP Eylem Planı Eksenlere Göre Proje Sayısı ve Harcama Bilgileri

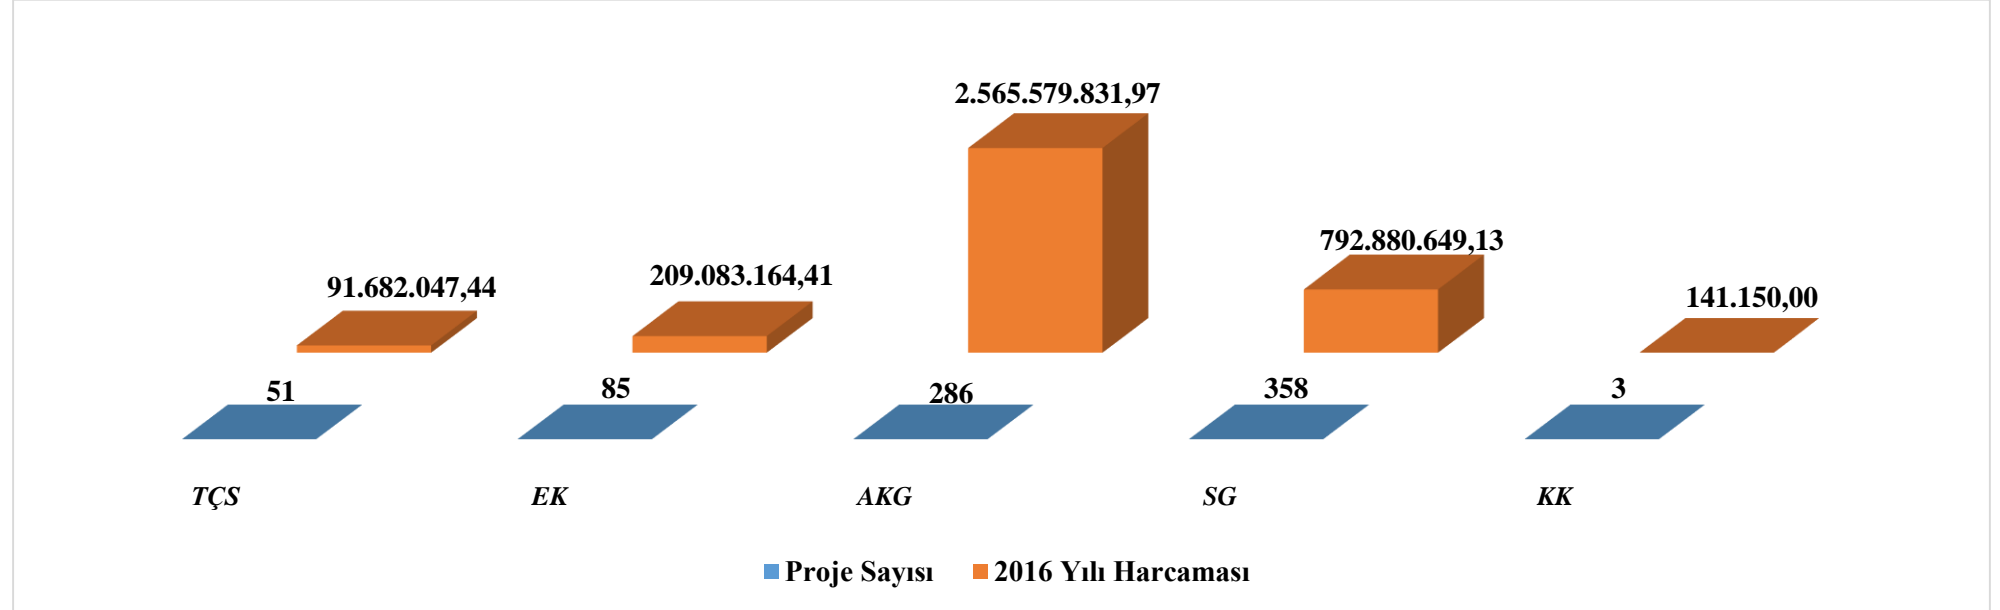

TÇS: Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

EK: Ekonomik Kalkınma

AKG: Altyapı ve Kentsel Gelişme

SG: Sosyal Gelişme

KK: Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

3.3.2 Eylemlere Göre Gerçekleşme Bilgileri

3.3.2.1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

DOKAP Eylem Planının Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik ekseninde; Turizm alt ekseninde 11 eylem, Çevresel Sürdürülebilirlik alt ekseninde 6 eylem olmak üzere toplam 17 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 1 tanesi tamamlanmış, 12 tanesinde ise uygulamalar devam etmektedir. 2016 yılında toplam 97.577.422,45 TL ödeneğin 91.682.047,44 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
TÇS	TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK		51	275.060.263,02	97.577.422,45	91.682.047,44
TÇS 1	TURİZM		18	252.302.486,00	81.457.149,87	77.020.374,84
TÇS 1.1	Yeşil Yol kapsamında yol iyileştirme ve yol yapım çalışmalarına devam edilecektir.	2014-2018	1	203.100.000,00	50.403.000,00	50.403.000,00
TÇS 1.2	Yeşil Yol güzergâhı üzerindeki turizm yatırımları desteklenecektir.	2015-2018	1	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
TÇS 1.3	Bölge yaylalarının karakteristiğini yansıtan mimari projeler hazırlanarak, uygulamaları yapılacak ve kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır.	2016-2018	1	2.500.000,00	44.000,00	0,00
TÇS 1.4	Tanıtım ve markalaşma çalışmalarına hız verilecektir.	2016-2018	1	4.300.000,00	33.000,00	32.922,00
TÇS 1.5	Turizm merkezlerinin imar planlamaları yapılacaktır.	2016-2017	1	4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TÇS 1.6	Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır.	2015-2016	1	0,00	0,00	0,00
TÇS 1.7	Giresun Adası Turizm ve Botanik Parkı etüd çalışmaları yapılacaktır.	2015-2016	0	0,00	0,00	0,00
TÇS 1.8	Bölgenin turizm gelişimine bağlı olarak ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücü kapasitesi oluşturulacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
TÇS 1.9	Bölgedeki kültür varlıkları korunacak, geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır.	2014-2018	9	28.632.426,00	21.140.635,87	17.560.392,84
TÇS 1.10	Tarihi kent bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline gelmesi sağlanacaktır.	2015-2018	3	2.370.060,00	936.514,00	124.060,00



E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
TÇS 1.11	Bölgenin, turizm gelişimine bağlı farklı alanlardaki potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
TÇS 2	ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK		33	22.757.777,02	16.120.272,58	14.661.672,60
TÇS 2.1	Milli park projeleri tamamlanacaktır.	2014-2018	26	19.069.767,02	14.609.994,58	13.329.844,87
TÇS 2.2	Biyokaçakçılıkla etkin mücadele sürdürülecektir.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
TÇS 2.3	Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projeleri tamamlanacaktır.	2014-2018	4	891.010,00	562.028,00	383.577,73
TÇS 2.4	Deniz kirliliği tespit edilecektir.	2015-2018	1	2.562.500,00	768.750,00	768.750,00
TÇS 2.5	Bölgede tarımsal kirliliğin izlenmesi ve azaltılması projesi uygulanacaktır.	2015-2017	0	0,00	0,00	0,00
TÇS 2.6	Bölgedeki küçük ve orta ölçekli nehir havzalarında iklim değişikliği ile ortaya çıkabilecek aşırı yağış ve sel (taşkın) koşullarında olası değişiklikler araştırılacaktır.	2015-2016	2	234.500,00	179.500,00	179.500,00

Uygulanması olan eylem.

Tamamlanan eylem.

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2016 yılı ödeneği ve harcaması olmayan eylemlerde uygulanan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.2.2. Ekonomik Kalkınma

DOKAP Eylem Planının Ekonomik Kalkınma ekseninde; Tarım alt ekseninde 21 eylem, Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge alt ekseninde 15 eylem ve Madencilik alt ekseninde 1 eylem olmak üzere toplam 37 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 29'unda uygulama olup, 2016 yılında toplam 287.139.542,67 TL ödeneğin 209.083.164,41 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
EK	EKONOMİK KALKINMA		85	671.479.709,24	298.484.011,77	209.083.164,41
EK 1	TARIM		46	228.380.874,13	135.051.008,42	69.378.103,10
EK 1.1	Tarımsal araştırmalar altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	1	5.219.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
EK 1.2	Çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri geliştirilecek ve araştırma ile yayım faaliyetleri entegre biçimde yürütülecektir.	2014-2018	4	0,00	0,00	0,00
EK 1.3	İl Gıda Kontrol Laboratuvarları için gerekli altyapı güçlendirilecektir.	2014-2016	1	4.359.000,00	100.000,00	100.000,00
EK 1.4	Sertifikalı tohum ve fidan üretimi ile kullanımı desteklenecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 1.5	Bölgenin bitkisel üretim potansiyeli değerlendirilecektir.	2014-2018	14	52.532.129,00	15.265.869,00	10.081.850,79
EK 1.6	Bölgedeki potansiyel organik havzalar tespit edilecek ve değerlendirilecektir.	2015-2016	1	2.450.000,00	900.000,00	900.000,00
EK 1.7	Çay ve fındık ürün kalitesi artırılabacaktır.	2016-2018	1	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00
EK 1.8	Meraların ıslah ihtiyacı belirlenecek ve sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır.	2014-2018	4	6.925.111,00	6.925.111,00	6.487.111,00
EK 1.9	Tarıma dayalı sanayi yatırım potansiyelinin araştırılması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.	2016-2018	1	1.724.000,00	600.000,00	600.000,00
EK 1.10	Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.	2014-2018	1	60.000.000,00	60.000.000,00	6.632.817,00
EK 1.11	Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumu desteklenecektir.	2015-2018	3	3.634.000,00	2.177.122,00	2.134.000,00



E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
EK 1.12	Hayvancılıkta örnek üretim sistemleri desteklenecektir.	2014-2018	4	2.374.820,00	1.810.000,00	1.808.083,00
EK 1.13	Arıcılık desteklenecektir.	2014-2018	3	4.104.678,00	2.817.000,00	2.798.766,21
EK 1.14	Su ürünleri sektörü geliştirilecektir.	2014-2018	3	18.552.240,00	6.652.240,00	6.630.513,00
EK 1.15	Bölgede soğuk hava depolama kapasitesi artırılacaktır.	2015-2017	1	790.000,00	424.000,00	418.040,58
EK 1.16	Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılacaktır.	2014-2018	1	34.746.896,13	6.599.666,42	2.954.408,57
EK 1.17	Tarımsal üreticilerin tarım dışı faaliyetlerden elde ettikleri gelir yükseltilecektir.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 1.18	Girdi temini ve ürün pazarlamaya ilişkin olarak üreticilerin ortak girişimleri desteklenecektir.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 1.19	Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır.	2014-2018	2	28.310.000,00	28.310.000,00	25.357.000,00
EK 1.20	Tıbbi aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım potansiyelleri araştırılacaktır.	2015-2017	1	1.409.000,00	720.000,00	725.512,95
EK 1.21	Organik gübre üretimine yönelik araştırmalar yapılacaktır.	2014-2016	0	0,00	0,00	0,00
EK 2	SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE		32	434.016.835,11	154.351.003,35	135.542.694,65
EK 2.1	İşletmelerarası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.	2015-2016	2	5.000.000,00	2.547.344,24	332.770,30
EK 2.2	Bölge ihracatının artırılması için özel nitelikli programlar uygulanacaktır.	2015-2018	6	76.594.061,30	76.594.061,30	76.594.061,30
EK 2.3	Bölge sınır kapıları güçlendirilecektir.	2015-2018	2	0,00	0,00	0,00
EK 2.4	Sınır ötesi işbirliğinin yapılması amacıyla gerekli etüd çalışmaları yapılacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 2.5	Orman ürünlerine yönelik sanayi desteklenecektir.	2015-2016	1	0,00	0,00	0,00
EK 2.6	İşletmelerin finansmana erişim imkânları iyileştirilecektir.	2014-2018	1	13.023.995,71	13.023.995,71	24.368.464,81



E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
EK 2.7	Organize sanayi bölgesi projeleri tamamlanacaktır.	2014-2018	7	217.312.309,00	21.576.035,00	19.207.874,00
EK 2.8	Küçük sanayi sitesi projeleri tamamlanacaktır.	2014-2016	4	78.838.000,00	10.859.098,00	9.096.504,00
EK 2.9	Yatırım Adası Projesi geliştirilecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 2.10	Doğu Karadeniz Yatırım Platformu kurulacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 2.11	Bölge tersanelerinin gelişimi desteklenecektir.	2015-2018	1	0,00	0,00	0,00
EK 2.12	Bölge'nin Ar-Ge, teknoloji ve yenilik kapasitesi artırılacaktır.	2014-2018	6	31.904.000,00	18.406.000,00	5.943.020,24
EK 2.13	Büyük ölçekli yatırımları çekmek amacıyla analitik çalışmalar yapılacaktır.	2015-2018	1	0,00	0,00	0,00
EK 2.14	Bölgede yatırım düzeyinin geliştirilmesine yönelik olarak iş ve yatırım ortamı iyileştirilecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
EK 2.15	Yöresel ürünler tespit edilecek ve coğrafi işaretleri alınacaktır.	2015-2018	1	0,00	0,00	0,00
EK 3	MADENCİLİK		7	9.082.000,00	9.082.000,00	4.162.366,66
EK 3.1	Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve ekonomiye kazandırılacaktır.	2015-2017	7	9.082.000,00	9.082.000,00	4.162.366,66

Uygulanması olan eylem.

Tamamlanan eylem.

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2016 yılı ödeneği ve harcaması olmayan eylemlerde uygulanan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.2.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme

DOKAP Eylem Planının Altyapı ve Kentsel Gelişme ekseninde; Ulaştırma ve Bilgi İletişim alt ekseninde 9 eylem, Tarımsal ve Kırsal Altyapı alt ekseninde 8 eylem, Enerji alt ekseninde 4 ve Kentsel Gelişme alt ekseninde 6 eylem olmak üzere toplam 27 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 1 tanesi tamamlanmış olup, 21'inde ise uygulamalara devam etmektedir. 2016 yılında toplam 2.883.019.100,17 TL ödeneğin 2.560.954.589,90 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
AKG	ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME		286	19.844.890.546,97	2.887.644.342,24	2.565.579.831,97
AKG 1	ULAŞTIRMA VE BİLGİ İLETİŞİM		126	13.764.134.476,63	1.823.863.788,41	1.595.212.992,79
AKG 1.1	Bölgede bulunan limanların etkin kullanım stratejileri geliştirilecektir.	2017-2018	0	0,00	0,00	0,00
AKG 1.2	Havayolu altyapısı geliştirilecektir.	2014-2018	5	1.370.256.000,00	102.770.000,00	2.870.102,01
AKG 1.3	Demiryolu altyapısı iyileştirilecek ve yeni demiryolu ağları için fizibilite çalışmaları yapılacaktır.	2014-2018	9	260.878.179,79	107.531.334,10	35.249.534,67
AKG 1.4	Bölgede karayolu ulaşım altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	102	9.639.902.512,98	1.285.466.859,31	1.234.302.761,12
AKG 1.5	Bölgenin kuzey-güney ulaşım bağlantılarını sağlayan ana arterler üzerinde yer alan projeler tamamlanacaktır.	2014-2018	5	2.421.206.783,86	309.095.595,00	309.095.595,00
AKG 1.6	İnsan ve yük taşımacılığı için modern teleferik sisteminin kurulması araştırılacaktır.	2015-2016	0	0,00	0,00	0,00
AKG 1.7	Bölgedeki balıkçı barınaklarının fiziki altyapıları iyileştirilecektir.	2014-2016	3	71.891.000,00	19.000.000,00	13.695.000,00
AKG 1.8	Ücretsiz kablosuz internet erişim noktaları (Wifi) kurulacaktır.	2015-2018	1	0,00	0,00	0,00



E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
AKG 1.9	Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) bulunduğu yerlerde fiber altyapı yaygınlığı sağlanacaktır.	2015-2018	1	0,00	0,00	0,00
AKG 2	TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI		47	3.887.405.696,78	546.693.283,84	542.053.468,69
AKG 2.1	Bölgede devam eden büyük su işleri hızlandırılarak sulama altyapısı geliştirilecektir.	2014-2018	6	1.230.360.667,00	93.430.000,00	90.928.150,00
AKG 2.2	Bölgedeki küçük sulama işleri tamamlanacaktır.	2014-2017	11	1.140.350.066,00	157.881.435,79	157.879.759,79
AKG 2.3	Bölgenin küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri kapsamında gölet ve kapalı sulama sistemlerinin yapımı desteklenecektir.	2016-2018	1	23.398.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
AKG 2.4	Bölge sulama sistemlerinin performansı izlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
AKG 2.5	Basınçlı sulama sistemleri ve etkin su kullanımı konusunda çiftçi ve teknik eleman eğitimi yapılacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
AKG 2.6	Bölge'de ıslah ve taşkın koruma faaliyetleri hızlandırılacaktır.	2015-2018	23	1.395.292.366,78	224.777.251,05	222.993.604,06
AKG 2.7	Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri tamamlanacaktır.	2014-2018	1	43.900.000,00	10.000.000,00	9.647.357,84
AKG 2.8	KÖYDES Projesi kapsamında kırsal altyapı sorunları çözüme kavuşturulacaktır.	2014-2018	5	54.104.597,00	54.104.597,00	54.104.597,00
AKG 3	ENERJİ		53	1.066.636.800,00	350.179.215,00	270.249.041,20
AKG 3.1	Bölgenin enerji üretim altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	1	486.875.000,00	153.545.015,00	145.301.320,00
AKG 3.2	Bölgenin enerji dağıtım altyapısı iyileştirilecektir.	2014-2018	48	535.797.800,00	183.432.200,00	124.947.721,20
AKG 3.3	Artvin ilinde doğalgaz iletim hatları tamamlanacaktır.	2014-2017	1	41.700.000,00	11.138.000,00	0,00
AKG 3.4	Bölgede yenilenebilir enerji çalışmaları desteklenecektir.	2014-2018	3	2.264.000,00	2.064.000,00	0,00



E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
AKG 4	KENTSEL GELİŞME		60	1.126.713.573,56	166.908.054,99	158.064.329,29
AKG 4.1	Şehirlerdeki rekreasyon alanlarının artırılması desteklenecektir.	2017-2018	0	0,00	0,00	0,00
AKG 4.2	Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim çalışmaları tamamlanacaktır.	2014-2018	1	77.224.409,20	60.526.275,00	51.684.051,00
AKG 4.3	Bölgede kanalizasyon ve içme suyu altyapıları ile arıtma sistemleri tamamlanacak mevcut olanlar geliştirilecektir.	2014-2018	56	833.548.524,36	105.391.779,99	105.390.278,29
AKG 4.4	Kırsal kesimde oluşan evsel atıklar toplanacaktır.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
AKG 4.5	Entegre Katı Atık Yönetim projeleri tamamlanacaktır.	2014-2018	2	214.700.640,00	0,00	0,00
AKG 4.6	Düzenli depolama alanları için yer tespiti çalışması ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırılacaktır.	2015-2017	1	1.240.000,00	990.000,00	990.000,00

Uygulanması olan eylem.

Tamamlanan eylem.

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2016 yılı ödeneği ve harcaması olmayan eylemlerde uygulanan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.2.4. Sosyal Gelişme

DOKAP Eylem Planının Sosyal Gelişme ekseninde; Eğitim alt ekseninde 11 eylem, Sağlık alt ekseninde 3 eylem, Sosyal Hizmetler ve Destekler alt ekseninde 10 ve Kültür ve Spor alt ekseninde 7 eylem olmak üzere toplam 31 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 1 tanesi tamamlanmış, 23'ünde ise uygulamalar devam etmektedir. 2016 yılında toplam 1.092.741.023,55 TL ödeneğin 792.880.649,13 TL'si harcanmıştır. Eylemler ile ilgili finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
SG	SOSYAL GELİŞME		358	4.397.665.767,13	1.092.741.023,55	792.880.649,13
SG 1	EĞİTİM		185	2.765.404.756,37	617.545.600,82	434.076.512,43
SG 1.1	Okulöncesi eğitimde fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranı artırılacaktır.	2014-2018	4	8.803.935,82	6.886.390,41	6.847.498,64
SG 1.2	İlköğretim ve ortaöğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir.	2014-2016	93	702.502.176,90	262.508.305,81	153.879.833,76
SG 1.3	Zenginleştirilmiş kütüphaneler yapılacaktır.	2015-2018	8	3.559.343,72	3.559.343,72	3.559.343,72
SG 1.4	Rehberlik Araştırma Merkezleri yaygınlaştırılacak ve kapasiteleri artırılacaktır.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 1.5	Okulların altyapı eksiklikleri tamamlanacaktır.	2014-2018	6	16.247.400,00	4.996.313,00	2.235.569,19
SG 1.6	Bölgenin yükseköğretim altyapısı geliştirilecektir.	2014-2018	50	1.531.927.319,93	302.165.425,55	234.824.444,79
SG 1.7	Bölge üniversitelerinde öğretim üyesi ihtiyacı giderilecektir.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 1.8	Bölge üniversitelerinde uluslararası öğrenci sayısının artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 1.9	Yurt sayısı ve kapasitesi alternatif finansman modelleri de kullanılarak artırılacaktır.	2014-2018	17	465.000.000,00	30.084.000,00	30.084.000,00
SG 1.10	Yerel yönetimler bünyesinde Kamu Bilişim Merkezleri kurulacaktır.	2015-2018	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00



E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
SG 1.11	İşgücünün istihdam edilebilirliğini ve mevcut çalışanların niteliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve gerekli altyapılar oluşturulacaktır.	2014-2018	6	36.364.580,00	6.345.822,33	2.645.822,33
SG 2	SAĞLIK		106	1.247.173.042,84	348.407.376,60	266.453.665,10
SG 2.1	Bölgede koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.	2014-2018	8	12.516.449,24	12.516.449,24	12.516.449,24
SG 2.2	Bölgenin sağlık alanındaki fiziki ve beşeri altyapı ihtiyacı giderilecektir.	2014-2018	96	1.234.643.000,00	335.877.333,76	253.923.622,26
SG 2.3	Bölge sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline getirilecektir.	2015-2016	2	13.593,60	13.593,60	13.593,60
SG 3	SOSYAL HİZMETLER ve DESTEKLER		35	178.280.590,11	45.997.465,68	32.120.880,07
SG 3.1	Bölge içi koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması sağlanacaktır.	2014-2018	5	37.860.000,00	8.562.761,00	5.332.760,00
SG 3.2	Engellilere yönelik eğitim ve istihdam hizmetlerinin niteliği artırılacaktır.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 3.3	Korunmaya muhtaç çocuklar için aile ortamına benzer ev tipi yapılar olan sevgi evlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.	2015-2016	1	2.837.000,00	2.183.000,00	2.183.000,00
SG 3.4	Engelli bireylerin hizmetlere ulaşımı, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımları sağlanacaktır.	2014-2018	3	13.400.000,00	7.000.000,00	5.845.339,00
SG 3.5	Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliği artırılacaktır.	2014-2018	3	0,00	0,00	0,00
SG 3.6	Yoğun göç veren kırsal alanlarda yaşayanlar başta olmak üzere yaşlılara ve engellilere yönelik bakım hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 3.7	Sosyal Etkileşim Programı uygulamaya geçirilecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
SG 3.8	Bölgede sosyal içerme projeleri uygulanacaktır.	2015-2018	2	55.223.000,00	6.000.000,00	0,00



E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
SG 3.9	Bölgenin kapsadığı tüm illerde sosyal analiz çalışmaları yapılacaktır.	2015-2017	1	0,00	0,00	0,00
SG 3.10	Bölgede gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	2014-2015	20	68.960.590,11	22.251.704,68	18.759.781,07
SG 4	KÜLTÜR VE SPOR		32	206.807.377,81	80.790.580,45	60.229.591,53
SG 4.1	Bölgenin kültür varlıkları envanteri çıkarılacaktır.	2016-2018	1	5.000.000,00	825.000,00	44.368,00
SG 4.2	Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve restorasyon işleri tamamlanacaktır.	2014-2018	1	30.357.873,81	20.592.199,79	14.371.504,29
SG 4.3	Trabzon Surlarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve çevre düzenleme projeleri yapımı desteklenecektir.	2014-2015	0	0,00	0,00	0,00
SG 4.4	Etnografya müzesi olmayan illerde yeni müzeler yapılacaktır.	2014-2018	2	400.000,00	213.000,00	0,00
SG 4.5	Kültür hizmetlerine erişim artırılacaktır.	2014-2018	1	228.650,00	228.650,00	228.650,00
SG 4.6	Spor altyapısı nicelik ve hizmet imkânları açısından iyileştirilecektir.	2014-2018	27	170.820.854,00	58.931.730,66	45.585.069,24
SG 4.7	Olimpik oyunlar için oluşturulan spor tesislerinin etkin kullanımı sağlanacaktır.	2015-2016	0	0,00	0,00	0,00

Uygulanması olan eylem.

Tamamlanan eylem.

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2016 yılı ödeneği ve harcaması olmayan eylemlerde uygulanan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.2.5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

DOKAP Eylem Planının Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde; Taşra Teşkilatı alt ekseninde 3 eylem, Yerel Yönetimler alt ekseninde 6 eylem, DOKAP BKİ ve Kalkınma Ajansları alt ekseninde 1, Sivil Toplum Kuruluşları alt ekseninde 1, Üniversiteler alt ekseninde 2, Diğer Kurum ve Kuruluşlar alt ekseninde 1 ve Genel alt ekseninde 2 eylem olmak üzere toplam 16 eylem tasarlanmıştır. Belirlenen eylemlerin 3'ünde uygulamalar devam etmekte olup, 2016 yılında belirlenen 148.650,00 TL ödeneğin, 141.150,00 TL'si harcanmıştır.

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
KK	YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ		3	148.650,00	148.650,00	141.150,00
KK 1	TAŞRA TEŞKİLATI		0	0,00	0,00	0,00
KK 1.1	İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 1.2	Bakanlıkların merkezi ve taşra teşkilatları arasında sistemli bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacaktır.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 1.3	Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının beşeri ve teknolojik kapasitesi geliştirilecektir.	2014-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 2	YEREL YÖNETİMLER		2	138.650,00	138.650,00	138.650,00
KK 2.1	Büyükşehir belediyelerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve gerekli görülen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 2.2	Belediyelerin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 2.3	İl özel idarelerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 2.4	Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 2.5	Büyükşehir belediyelerinin bilişim stratejisi hazırlıklarına mali ve teknik destek sağlanacaktır.	2015-2018	1	0,00	0,00	0,00



E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Başlama- Bitiş Tarihi	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
KK 2.6	Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesi desteklenecektir.	2015-2018	1	138.650,00	138.650,00	138.650,00
KK 3	DOKAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI		1	10.000,00	10.000,00	2.500,00
KK 3.1	DOKAP BKİ ve kalkınma ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018	1	10.000,00	10.000,00	2.500,00
KK 4	SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI		0	0,00	0,00	0,00
KK 4.1	Bölgedeki STK'ların beşeri gelişimleri desteklenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 5	ÜNİVERSİTELER		0	0,00	0,00	0,00
KK 5.1	Bölge üniversitelerinde çalışan personelin eğitim ihtiyaç analizi yapılacak ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitimler sağlanacaktır.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 5.2	Bölge üniversitelerinin 5018 sayılı kanun uygulamaları desteklenecektir.	2015-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 6	DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR		0	0,00	0,00	0,00
KK 6.1	Çiftçi örgütlerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve gerekli görülen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 7	GENEL		0	0,00	0,00	0,00
KK 7.1	Kamu kurumlarında üst düzey görevlerde bulunmuş ancak hâlihazırda emekli olan kişilerin bilgi ve tecrübelerinden ihtiyaçlar doğrultusunda istifade edilecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00
KK 7.2	Yerel yönetimler, merkezi idarelerin taşra teşkilatları, STK'lar, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kurumsal yetkinlik analizi gerçekleştirilecek ve tespit edilen idari, mali, beşeri ve teknolojik eksikliklerin giderilmesine ilişkin destek programları düzenlenecektir.	2016-2018	0	0,00	0,00	0,00


Uygulanması olan eylem.

Not: Eylemler ile ilgili bilgiler sorumlu kuruluşlardan gelen verilere göre düzenlenmiştir. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2016 yılı ödeneği ve harcaması olmayan eylemlerde uygulanan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.3. Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri

DOKAP Eylem Planında yer alan eylemler için 37 sorumlu kuruluş tayin edilmiştir. Bu kuruluşların alt kuruluşları ile beraber toplam 40 kurum ve kuruluş DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş/gerçekleştirecektir. 2016 yılı itibarıyla DOKAP Bölgesi'nde en fazla yatırımı 1.543.398.356,12 TL ile Karayolları Genel Müdürlüğü gerçekleştirmiştir.

Grafik 2: DOKAP Eylem Planı Kurumlara Göre 2016 Yılı Ödenek ve Harcama Bilgisi (TL)

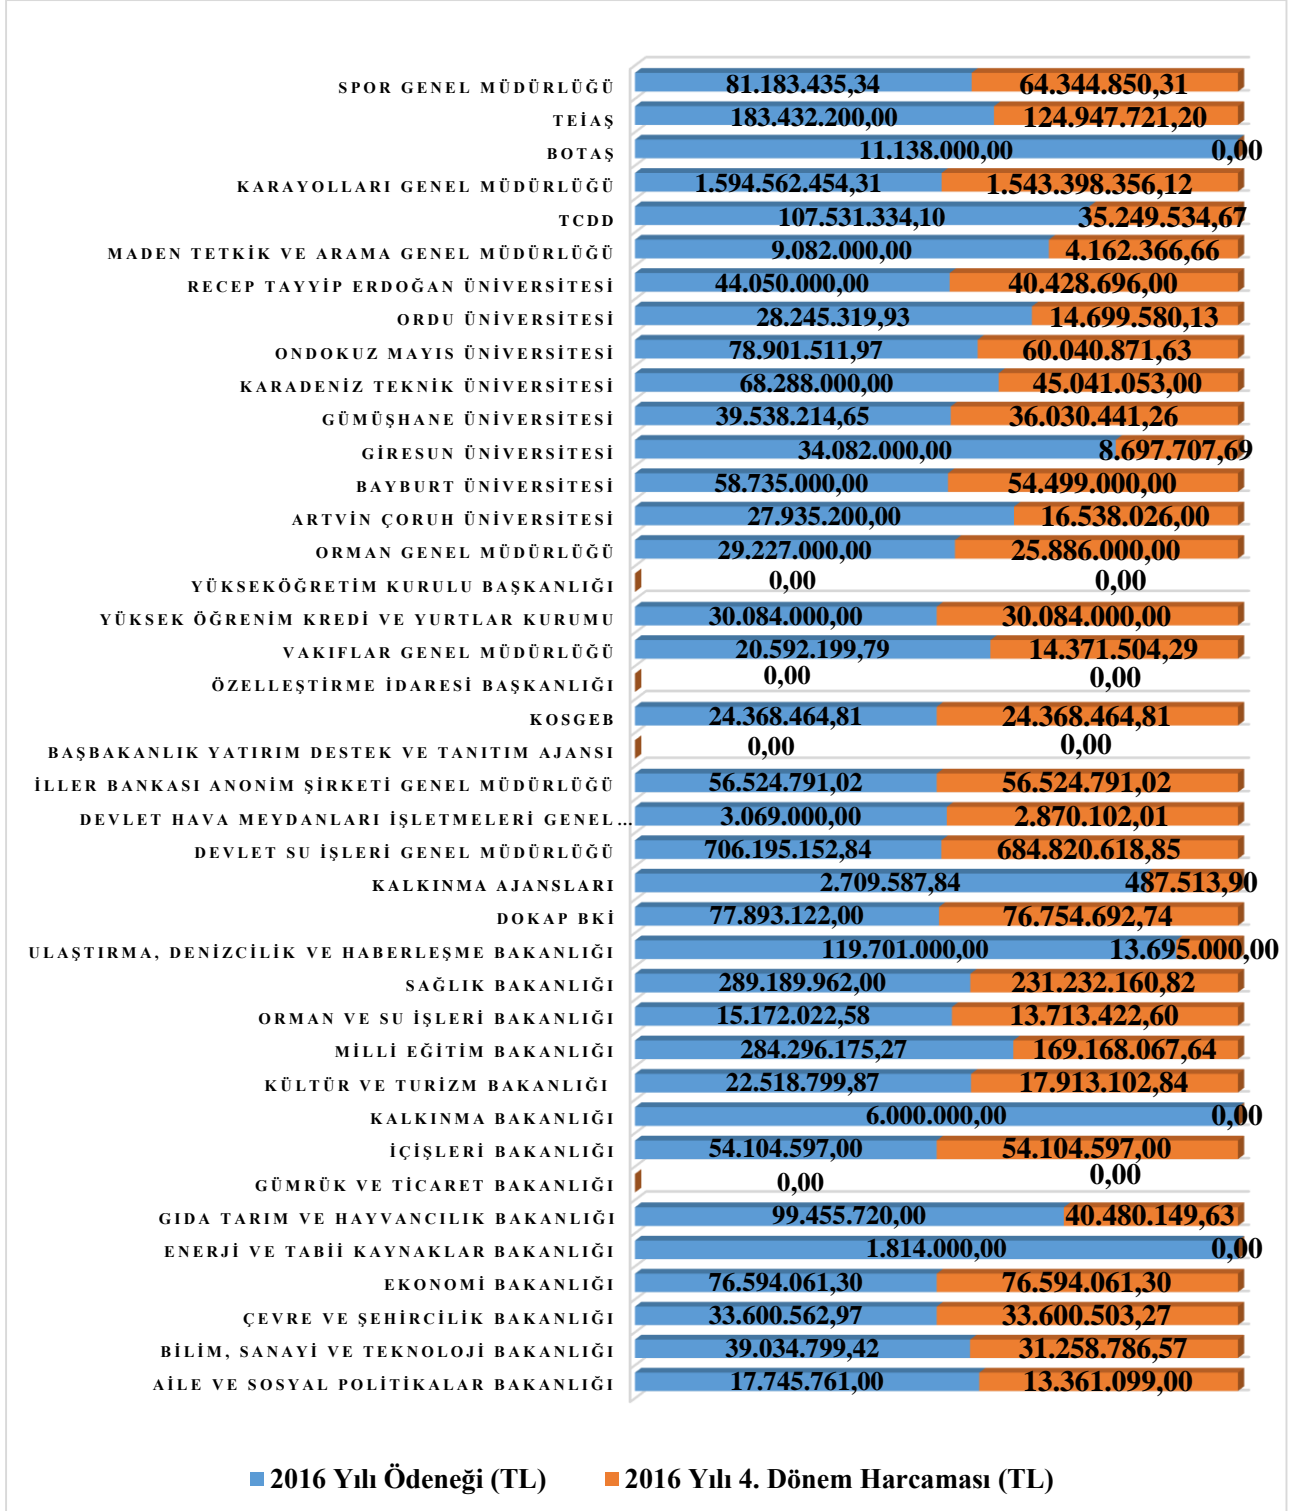

Aşağıdaki tabloda, 2016 yılında DOKAP Eylem Planı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş ve 2018 yılına kadar gerçekleştirecek olan kurumların, finansal ve sorumlu olduğu eylem sayıları hakkında ki bilgiler yer almaktadır.

EKSEN / KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Uygulanması Olan Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSEN TOPLAMI	17	13	51	275.060.263,02	97.577.422,45	91.682.047,44
TURİZM	11	8	18	252.302.486,00	81.457.149,87	77.020.374,84
DOKAP BKİ	8	5	5	221.300.000,00	59.380.000,00	59.335.922,00
Kalkınma Ajansları	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Kültür ve Turizm Bakanlığı	2	2	12	31.002.486,00	22.077.149,87	17.684.452,84
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	6	5	33	22.757.777,02	16.120.272,58	14.661.672,60
Orman ve Su İşleri Bakanlığı	3	3	30	19.960.777,02	15.172.022,58	13.713.422,60
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	1	1	1	2.562.500,00	768.750,00	768.750,00
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	2	1	2	234.500,00	179.500,00	179.500,00
EKONOMİK KALKINMA EKSEN TOPLAMI	45	34	87	671.479.709,24	298.484.011,77	209.083.164,41
TARIM	24	18	46	228.380.874,13	135.051.008,42	69.378.103,10
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	1	1	1	34.746.896,13	6.599.666,42	2.954.408,57
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	12	7	26	146.670.480,00	89.276.220,00	30.653.291,79
DOKAP BKİ	9	8	15	17.736.498,00	9.948.122,00	9.884.403
Orman Genel Müdürlüğü	2	2	4	29.227.000,00	29.227.000,00	25.886.000,00
SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE	20	15	34	434.016.835,11	154.351.003,35	135.542.694,65
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	4	3	13	296.150.309,00	32.435.133,00	28.304.378,00
Ekonomi Bakanlığı	2	1	6	76.594.061,30	76.594.061,30	76.594.061,30
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı	1	1	2	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ	2	0	0	0,00	0,00	0,00

EKSEN / KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Uygulanması Olan Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
Kalkınma Ajansları	4	3	5	5.000.000,00	2.547.344,24	332.770,30
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı	1	1	1	0,00	0,00	0,00
KOSGEB	1	1	1	24.368.464,81	24.368.464,81	24.368.464,81
Bayburt Üniversitesi	1	1	1	6.188.000,00	10.000,00	10.000,00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	1	1	5.143.000,00	5.143.000,00	5.143.000,00
Ordu Üniversitesi	1	1	1	495.000,00	495.000,00	314.190,24
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	1	1	1	2.800.000,00	2.800.000,00	475.830,00
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	1	2	17.278.000,00	9.958.000,00	0,00
MADENCİLİK	1	1	7	9.082.000,00	9.082.000,00	4.162.366,66
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü	1	1	7	9.082.000,00	9.082.000,00	4.162.366,66
ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME EKSEN TOPLAMI	30	23	286	19.844.890.546,97	2.887.644.342,24	2.565.579.831,97
ULAŞTIRMA VE BİLGİ İLETİŞİM	10	6	126	13.764.134.476,63	1.823.863.788,41	1.595.212.992,79
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	4	2	6	1.421.891.000,00	118.701.000,00	13.695.000,00
Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği Genel Müdürlüğü	1	1	4	20.256.000,00	3.069.000,00	2.870.102,01
DOKAP BKİ	2	0	0	0,00	0,00	0,00
TCDD	1	1	9	260.878.179,79	107.531.334,10	35.249.534,67
Karayolları Genel Müdürlüğü	2	2	107	12.061.109.296,84	1.594.562.454,31	1.543.398.356,12
TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI	7	5	47	3.887.405.696,78	546.693.283,84	542.053.468,69
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	1	1	1	43.900.000,00	10.000.000,00	9.647.357,84
DOKAP BKİ	3	1	1	23.398.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
DSİ	2	2	40	3.766.003.099,78	476.088.686,84	471.801.513,85
İçişleri Bakanlığı	1	1	5	54.104.597,00	54.104.597,00	54.104.597,00

EKSEN / KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Uygulanması Olan Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
ENERJİ	5	5	53	1.066.636.800,00	350.179.215,00	270.249.041,20
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	1	1	2	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00
DSİ	1	1	1	486.875.000,00	153.545.015,00	145.301.320,00
DOKAP BKİ	1	1	1	450.000,00	250.000,00	0,00
BOTAŞ	1	1	1	41.700.000,00	11.138.000,00	0,00
TEİAŞ	1	1	48	535.797.800,00	183.432.200,00	124.947.721,20
KENTSEL GELİŞME	8	6	60	1.126.713.573,56	166.908.054,99	158.064.329,29
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	3	2	7	364.977.292,78	32.831.812,97	32.831.753,27
DOKAP BKİ	2	1	1	1.240.000,00	990.000,00	990.000,00
DSİ	2	2	5	467.427.330,20	76.561.451,00	67.717.785,00
İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü	1	1	47	293.068.950,58	56.524.791,02	56.524.791,02
SOSYAL GELİŞME EKSEN TOPLAMI	39	33	358	4.397.665.767,13	1.092.741.023,55	792.880.649,13
EĞİTİM	17	15	185	2.765.404.756,37	617.545.600,82	434.076.512,43
Milli Eğitim Bakanlığı	6	5	117	767.477.436,44	284.296.175,27	169.168.067,64
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu	1	1	17	465.000.000,00	30.084.000,00	30.084.000,00
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı	1	0	0	0,00	0,00	0,00
Artvin Çoruh Üniversitesi	1	1	7	165.701.000,00	27.935.200,00	16.538.026,00
Bayburt Üniversitesi	1	1	7	164.054.000,00	58.725.000,00	54.489.000,00
Giresun Üniversitesi	1	1	6	189.680.000,00	31.582.000,00	8.082.965,99
Gümüşhane Üniversitesi	1	1	6	140.612.000,00	39.538.214,65	36.030.441,26


EKSEN / KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Uygulaması Olan Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	1	6	230.530.000,00	32.330.000,00	28.465.498,00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	1	6	277.300.000,00	43.054.690,97	36.880.257,65
Ordu Üniversitesi	1	1	6	164.750.319,93	27.750.319,93	14.385.389,89
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	1	1	6	199.300.000,00	41.250.000,00	39.952.866,00
SAĞLIK	6	6	106	1.247.173.042,84	348.407.376,60	266.453.665,10
Sağlık Bakanlığı	2	2	99	1.083.587.449,24	289.189.962,00	231.232.160,82
Giresun Üniversitesi	1	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	614.741,70
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	1	2	48.072.000,00	30.703.821,00	18.017.613,98
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	1	2	113.000.000,00	26.000.000,00	16.575.555,00
Kalkınma Ajansları	1	1	2	13.593,60	13.593,60	13.593,60
SOSYAL HİZMETLER ve DESTEKLER	9	7	35	178.280.590,11	45.997.465,68	32.120.880,07
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı	6	4	12	54.097.000,00	17.745.761,00	13.361.099,00
Spor Genel Müdürlüğü	1	1	20	68.960.590,11	22.251.704,68	18.759.781,07
Kalkınma Bakanlığı	1	1	2	55.223.000,00	6.000.000,00	0,00
Kalkınma Ajansları	1	1	1	0,00	0,00	0,00
KÜLTÜR VE SPOR	7	5	32	206.807.377,81	80.790.580,45	60.229.591,53
Kültür ve Turizm Bakanlığı	2	2	3	628.650,00	441.650,00	228.650,00
DOKAP BKİ	2	1	1	5.000.000,00	825.000,00	44.368,00
Vakıflar Genel Müdürlüğü	1	1	1	30.357.873,81	20.592.199,79	14.371.504,29
Spor Genel Müdürlüğü	1	1	27	170.820.854,00	58.931.730,66	45.585.069,24
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	1	0	0	0,00	0,00	0,00

EKSEN / KURULUŞ	Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı	Uygulanması Olan Eylem Sayısı	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	2016 Yılı Ödeneği (TL)	2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)
YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	16	3	3	148.650,00	148.650,00	141.150,00
EKSEN TOPLAMI	16	3	3	148.650,00	148.650,00	141.150,00
TAŞRA TEŞKİLATI	3	0	0	0,00	0,00	0,00
İçişleri Bakanlığı	1	0	0	0,00	0,00	0,00
Ortak Proje	2	0	0	0,00	0,00	0,00
YEREL YÖNETİMLER	6	2	2	138.650,00	138.650,00	138.650,00
DOKAP BKİ	3	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkınma Ajansları	3	2	2	138.650,00	138.650,00	138.650,00
DOKAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI	1	1	1	10.000,00	10.000,00	2.500,00
Kalkınma Ajansları	1	1	1	10.000,00	10.000,00	2.500,00
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI	1	0	0	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ	1	0	0	0,00	0,00	0,00
ÜNİVERSİTELER	2	0	0	0,00	0,00	0,00
Üniversiteler	2	0	0	0,00	0,00	0,00
DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR	1	0	0	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ	1	0	0	0,00	0,00	0,00
GENEL	2	0	0	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ	2	0	0	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	128	89	783	25.189.244.936,36	4.376.595.450,01	3.659.366.842,95

Not: DOKAP Eylem Planı 128 eylemden oluşmaktadır. 3 eylemin uygulamaları tamamlanmıştır. 89 eylemde ise faaliyetler devam etmektedir. Yukarıda yer alan tabloda ki sayıların farklı olması, bir eylemde bir veya birkaç kurumun sorumluluğunda projelerin yer almasıdır. (Proje sayısı olmasına rağmen, proje tutarı, 2016 yılı ödeneği ve harcaması olmayan projeler etüt aşamasında olup, ilgili ödenekler daha sonraki dönemlerde belirlenecektir.)

3.3.4. Yapılan Harcamaların İllere Göre Dağılımı

2016 yılında DOKAP Eylem Planı kapsamında yapılan yatırımlardan en fazla payı 187 proje altında 628.476.398,17 TL ile Trabzon ili, en az payı ise 87 proje altında 211.610.612,60 TL ile Bayburt ili almıştır. DOKAP Eylem Planı'nda yer alan proje sayılarının ve harcamam tutarlarının illere göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.

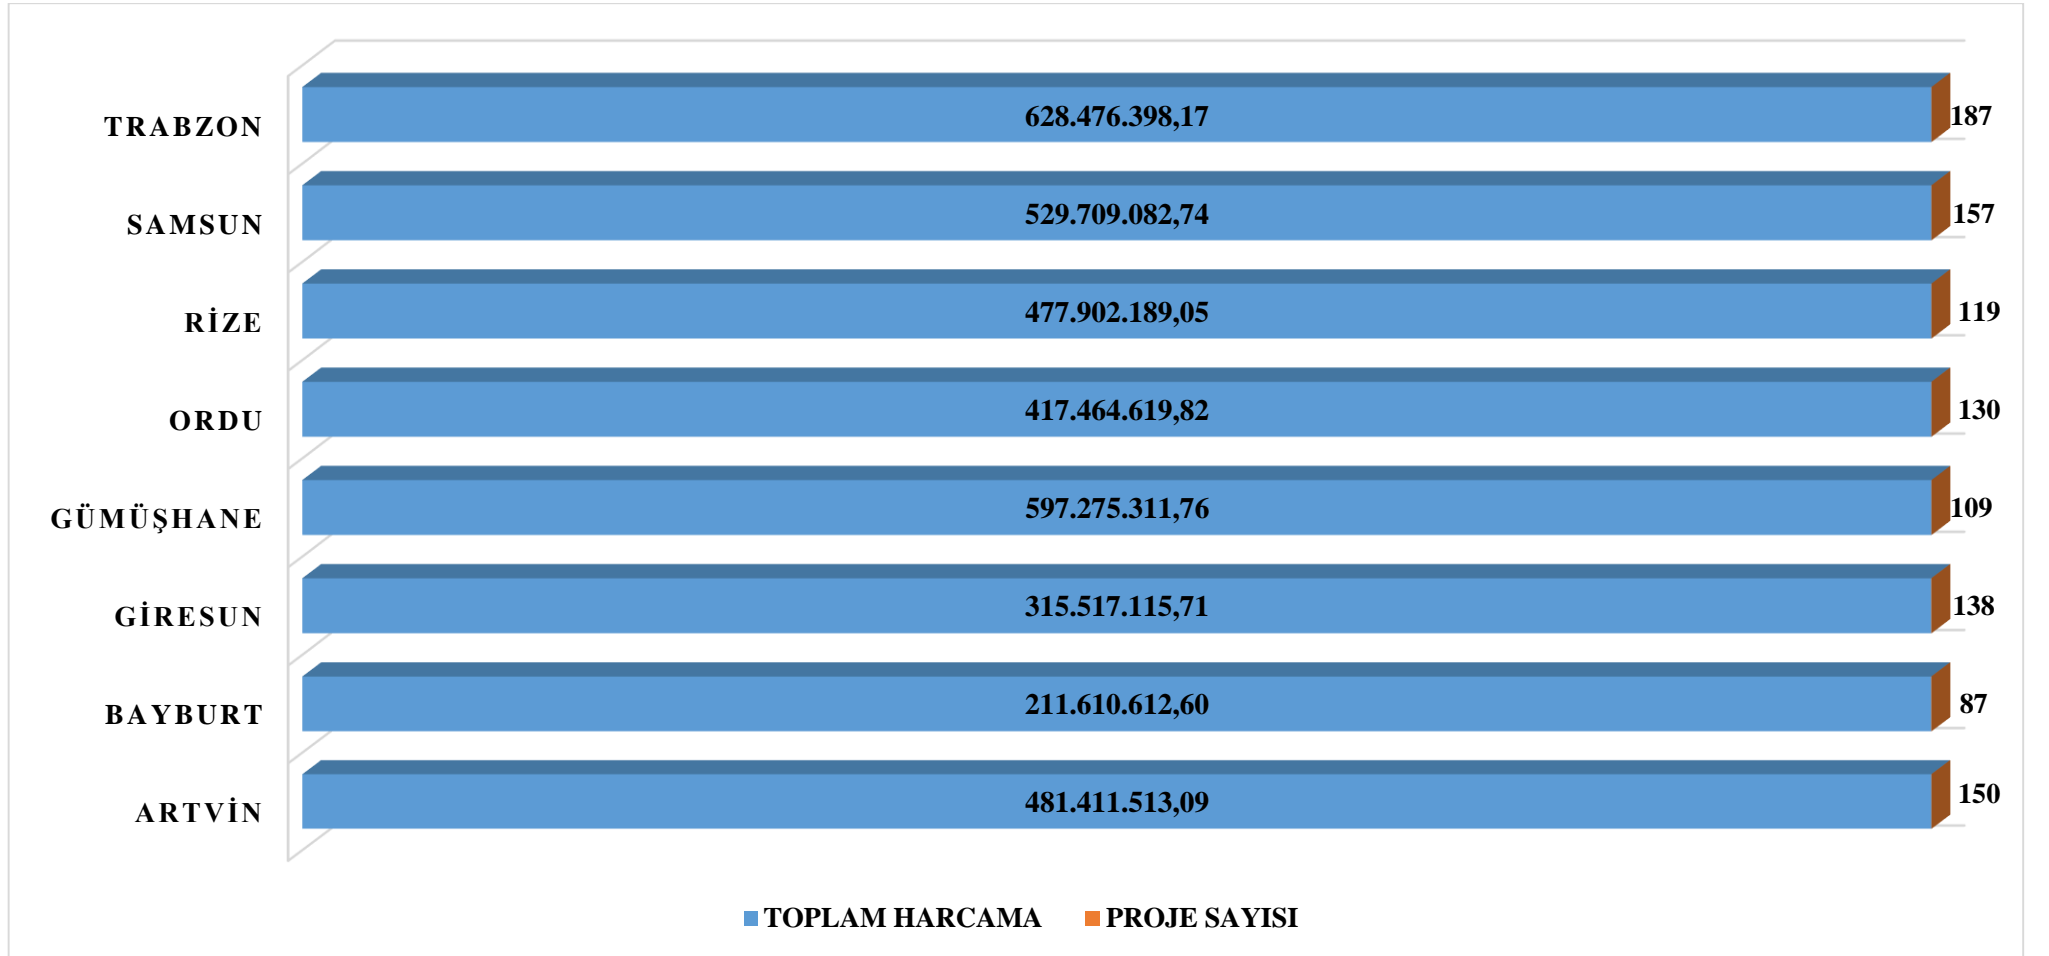



DOKAP Eylem Planı Kapsamında Gerçekleştirilen Proje Sayılarının İllere Göre Dağılımı

E. NO	GELİŞME EKSENİ ADI	Artvin	Bayburt	Giresun	Gümüşhane	Ordu	Rize	Samsun	Trabzon
TÇS	TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	14	7	11	10	8	11	13	17
TÇS 1	TURİZM	8	5	7	5	5	6	5	12
TÇS 2	ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	6	2	4	5	3	5	8	5
EK	EKONOMİK KALKINMA	30	24	30	26	34	30	23	37
EK 1	TARIM	19	16	20	17	22	18	17	19
EK 2	SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE	8	5	6	5	9	9	5	12
EK 3	MADENCİLİK	3	3	4	4	3	3	1	6
AKG	ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME	64	26	38	37	34	41	40	57
AKG 1	ULAŞTIRMA VE BİLGİ İLETİŞİM	21	11	12	12	15	22	20	31
AKG 2	TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI	20	7	4	5	2	2	9	1
AKG 3	ENERJİ	17	3	9	12	12	7	8	8
AKG 4	KENTSEL GELİŞME	6	5	13	8	5	10	3	17
SG	SOSYAL GELİŞME	41	30	58	34	51	36	81	74
SG 1	EĞİTİM	22	20	23	17	22	22	39	35
SG 2	SAĞLIK	10	4	23	3	23	7	16	24
SG 3	SOSYAL HİZMETLER ve DESTEKLER	5	2	9	7	2	3	10	7
SG 4	KÜLTÜR VE SPOR	4	4	3	7	4	4	16	8
KK	YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	1	0	1	2	3	1	0	2
KK 1	TAŞRA TEŞKİLATI	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 2	YEREL YÖNETİMLER	0	0	0	1	2	0	0	1
KK 3	DOKAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI	1	0	1	1	1	1	0	1
KK 4	SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 5	ÜNİVERSİTELER	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 6	DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR	0	0	0	0	0	0	0	0
KK 7	GENEL	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM		150	87	138	109	130	119	157	187

DOKAP Eylem Planı kapsamında 2016 yılında uygulanan projelerin sayıları yukarıda, projelerin harcama tutarları ise eksen/alt eksen bazında aşağıdaki tabloda, DOKAP Bölgesi illeri bazında verilmiştir.

DOKAP Eylem Planı Kapsamında Gerçekleştirilen Yatırımların İllere Göre Dağılımı (TL)

EKSEN / KURULUŞ	Artvin	Bayburt	Giresun	Gümüşhane	Ordu	Rize	Samsun	Trabzon
TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	13.354.898,12	5.117.377,95	11.949.563,93	10.472.021,00	8.628.281,21	15.939.754,14	7.823.356,18	18.396.794,91
TURİZM	12.603.479,12	4.936.371,55	9.575.918,95	7.166.615,25	7.336.615,25	11.656.675,25	6.170.615,25	17.574.084,22
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	751.419,00	181.006,40	2.373.644,98	3.305.405,75	1.291.665,96	4.283.078,89	1.652.740,93	822.710,69
EKONOMİK KALKINMA	17.293.139,34	6.447.537,07	17.258.958,98	4.441.318,96	17.232.881,13	23.715.445,67	42.666.464,71	80.027.418,57
TARIM	14.600.255,67	5.388.296,82	11.787.544,89	2.428.993,87	8.480.612,25	4.253.663,23	10.439.846,61	11.998.889,78
SANAYİ, GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE	2.596.628,51	712.814,05	4.564.999,27	1.043.144,42	8.007.104,21	19.365.527,28	32.226.618,10	67.025.858,81
MADENCİLİK	96.255,16	346.426,20	906.414,82	969.180,67	745.164,67	96.255,16	0,00	1.002.669,98
ALTYAPI VE KENTSEL GELİŞME	410.533.395,91	102.242.479,42	220.411.812,96	526.864.139,32	278.278.117,43	379.123.021,55	223.272.054,42	424.854.810,97
ULAŞTIRMA VE BİLGİ İLETİŞİM	115.150.000,00	25.881.000,00	88.259.000,00	373.173.000,00	209.800.440,03	298.154.000,00	121.617.574,63	363.177.978,14
TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI	41.544.562,31	69.079.651,54	102.003.864,00	128.954.500,00	21.215.408,00	57.780.017,00	95.300.668,84	26.174.797,00
ENERJİ	200.730.320,00	0,00	3.370.500,00	15.792.500,00	36.262.221,20	2.613.000,00	4.231.500,00	7.249.000,00
KENTSEL GELİŞME	53.108.513,60	7.281.827,88	26.778.448,96	8.944.139,32	11.000.048,20	20.576.004,55	2.122.310,95	28.253.035,83
SOSYAL GELİŞME	40.229.663,06	97.803.218,16	65.896.363,18	55.428.090,82	113.255.598,39	59.123.551,03	255.947.207,44	105.196.957,05
EĞİTİM	22.064.401,86	88.859.117,61	40.590.778,43	47.980.947,77	36.280.454,62	52.962.671,54	76.843.787,07	68.494.353,53
SAĞLIK	11.619.973,47	6.137.634,47	15.423.501,53	2.487.312,56	75.146.524,96	3.322.285,49	130.296.523,31	22.019.909,31
SOSYAL HİZMETLER ve DESTEKLER	4.300.395,31	1.830.000,00	7.927.659,76	4.554.131,93	1.788.262,81	1.552.600,00	5.615.757,89	4.552.072,37
KÜLTÜR VE SPOR	2.244.892,42	976.466,08	1.954.423,46	405.698,56	40.356,00	1.285.994,00	43.191.139,17	10.130.621,84
YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	416,67	0,00	416,67	69.741,67	69.741,67	416,67	0,00	416,67
TAŞRA TEŞKİLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EKSEN / KURULUŞ	Artvin	Bayburt	Giresun	Gümüşhane	Ordu	Rize	Samsun	Trabzon
YEREL YÖNETİMLER	0,00	0,00	0,00	69.325,00	69.325,00	0,00	0,00	0,00
DOKAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI	416,67	0,00	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00	416,67
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÜNİVERSİTELER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	481.411.513,09	211.610.612,60	315.517.115,71	597.275.311,76	417.464.619,82	477.902.189,05	529.709.082,74	628.476.398,17



3.4. DOKAP Eylem Planı Kapsamında Yapılan Faaliyetler

DOKAP Eylem Planı (2014-2018); bölgede yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılan ve hala devam eden yatırımları tamamlamak, yapılan yatırımlarla doğan potansiyeli ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin hızlandırılması yönünde tam olarak kullanmak, Bölge'nin rekabet gücünü artırmak ve DOKAP Bölgesini daha ileriye taşımak amacıyla hazırlanmıştır.

DOKAP Eylem Planı ile bölgenin önemli potansiyeli olan turizm alanında önemli gelişmelerin sağlanması, bölgenin ekonomik refah düzeyinin artırılması ve ülke kalkınmasına azami ölçüde katkı sağlaması, tarım başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen üretimin bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlaması, özellikle göç ve yeni istihdam alanı oluşturma konusunda yaşanan kısıtlılıkların giderilmesine çalışılacaktır.

DOKAP Eylem Planı'nda beş ana gelişme eksenini kapsandaki 20 alt eksen başlığı altında 128 eylem ve bu eylemleri gerçekleştirmeye yönelik 325 proje ve faaliyet yer almaktadır.

Gelişme Eksenleri:

1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik
2. Ekonomik Kalkınma
3. Altyapı ve Kentsel Gelişme
4. Sosyal Gelişme
5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesidir.

DOKAP Eylem Planı'nın uygulanmasında, izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluş DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıdır. Planın bölge düzeyinde uygulanmasından Eylem Planı'nda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşları sorumlu olacaklardır.

DOKAP Eylem Planı uygulamaları için öngörülen toplam finansman ihtiyacı 10,4 milyar TL'dir. 2016 yılında DOKAP Eylem Planı'nın uygulanması için 2,149 milyar TL ödenek kullanılması öngörülmüştür.

DOKAP Eylem Planı kapsamında belirlenen eylemlerin uygulanabilmesi için 2016 yılında 4,38 milyar TL program ödeneği tahsis edilmiş olup yılsonu harcaması 3,66 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 Yılı sonu itibariyle DOKAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetle, eksen ve alt eksen bazında aşağıda özetlenmiştir.



3.4.1. Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

Turizm

- Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları kapsamında uygulanan Yeşil Yol Projesine 2016 yılında tahsis edilen ödenekler ile Artvin ilinde yaklaşık 54,59 km uzunluğundaki güzergâhta, Bayburt ilinde yaklaşık 13,50 km uzunluğundaki güzergâhta, Giresun ilinde yaklaşık 34,40 km uzunluğundaki güzergâhta, Gümüşhane ilinde yaklaşık 22,20 km uzunluğundaki güzergâhta, Ordu ilinde yaklaşık 19,675 km uzunluğundaki güzergâhta, Rize ilinde yaklaşık 27,50 km uzunluğundaki güzergâhta, Samsun ilinde yaklaşık 28,00 km uzunluğundaki güzergâhta, Trabzon ilinde yaklaşık 47,50 km uzunluğundaki güzergâhta olmak üzere toplam 247,36 km güzergâhta iyileştirme çalışmaları yapılması için sözleşmeler yapılmış olup, imalatlar devam etmektedir.
- Yeşil Yol güzergâhı üzerindeki turizm yatırımları desteklenmesi amacıyla DOKAP Bölgesinde bulunan Kalkınma Ajanslarıyla (DOKA, OKA, KUDAKA) Başkanlığımız arasında protokol yapılmış olup 6,9 milyon TL ajansların proje için açılmış olan hesaplarına aktarılmıştır.
- DOKAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında strateji ve eylem planı hazırlanması için "DOKAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Stratejisi ve Eylem Planı Hizmet Alımı" işinin sözleşmesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.



Gümüşhane Karaca Mağarası



Doğu Karadeniz Tanıtım ve Markalaşma



Giresun-Paşakonaklı Yaylası



Bayburt-Aydıntepe



Artvin-Şavşat Taşköprü



Rize-Zilkale Şenyuva



Samsun- Kuş Cenneti



Trabzon-Kayabaşı



- Turizm merkezlerinin imar planlamalarının yapılması için İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Protokol imzalanmıştır. 26/09/2016 tarihinde Kalkınma Bakanlığında İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başkanlığımızın katılımıyla toplantı yapılarak proje kapsamında çalışma yapılacak alanlar, taraflar arasında mutabık kalınarak belirlenmiştir.
- Bölgenin yat ve kurvaziyer turizmi potansiyelinin geliştirilmesi kapsamında DOKA tarafından, kruvaziyer ile ilgili Trabzon Kruvaziyer Limanı projesi ve Mavi Rota Projesi önerileri geliştirilmiştir. Uluslararası Kruvaziyer Konferansının düzenlenmesi planlanmaktadır.
- Kültür varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve turizme kazandırılması eylemi kapsamında Artvin Ardanuç Kültür Evi Restorasyonu projesi ve Trabzon Müzesi (Kostaki Konağı) restorasyon işi tamamlanmıştır. Artvin İşhan Kilisesi restorasyonu, Artvin Yeni Arkeoloji Müzesi ve Trabzon Sümela Örenyeri onarım işi devam etmektedir. Ayrıca muhtelif işler kapsamında DOKAP Bölgesi illerindeki ilgili kuruluşlara 10,8 milyon TL ödenek aktarılmıştır.
- Tarihi kent bölgelerinin bir bütün olarak korunması, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilmesi yönelik çalışmalar kapsamında, Rize Atatürk Evi Müzesi Restorasyon ve Çevre Düzenleme işi tamamlanmıştır. Samsun Yeni Arkeoloji Müzesi ve Trabzon Kostaki Konağı Müzesi Çevre Düzenlenmesi işlerinde çalışmalar devam etmektedir.



Ardanuç Kültür Evi



Kostaki Konağı



Rize Atatürk Evi



İşhan Kilisesi



Trabzon Sümela Manastırı



Trabzon Kızlar Manastırı



Samsun Gazi Müzesi



Çevresel Sürdürülebilirlik

- 'Milli Park Projeleri tamamlanacaktır' eylemi kapsamında,
 - ✓ Artvin ilinde, Borçka Karagöl Tabiat Parkı Halihazır Harita, İmar Planı Esas Jeolojik-Geoteknik Etüt Raporu ve Nazım ve Uygulama İmar Planları Hazırlanması Hizmet Alımı İşi ve Altıparmak Tabiat Parkı Gelişme Planı İşi tamamlanmıştır.
 - ✓ Bayburt ilinde, Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı İçin Bayrak Alımı ve Tanıtım tabelası yapım işi tamamlanmıştır. Ayrıca, Yakupabdal Tabiat Parkı Halihazır Harita ve Peyzaj Uygulama Projesi devam etmektedir.
 - ✓ Gümüşhane ilinde, Limni Gölü Tabiat Parkı 5 hektarlık kısmı için 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılması işi tamamlanmıştır.
 - ✓ Ordu ilinde, Ulugöl Tabiat Parkına Gelişme Planı yapımı işi tamamlanmış, Çınarsuyu Tabiat Parkına Gelişme Planı yapım işi devam etmektedir.
 - ✓ Rize ilinde, Tunca Vadisi TP Çevre Düzenleme Yol Sanat Yapıları işi çalışmaları ve Kaçkar Dağları Milli Parkı İmar Planı Yapımı işi tamamlanmıştır.
 - ✓ Trabzon ilinde, Sera Gölü TP plan Proje Yapımı çalışmaları tamamlanmıştır.
- 'Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projeleri tamamlanacaktır.' eylemi kapsamında yürütülen projelerin Artvin, Bayburt, Giresun ve Gümüşhane illerindeki uygulamaları devam etmektedir.
- Deniz kirliliğinin takip edilebilmesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karadeniz de 2016 yılında 2 kez kirlilik izlemesi gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı çalışması tamamlanarak muayene kabulü yapılmıştır.



Limni Gölü



KOP Dağı Milli Park



Terme Çayı



Sera Gölü



Sargüzel Tabiat Parkı



Karagöl Tabiat Parkı



3.4.2. Ekonomik Kalkınma

Tarım

- DOKAP Bölgesi'nin tarımsal araştırmalar altyapısının iyileştirilmesi kapsamında Samsun ilinin Tekkeköy ilçesinde Enerji Tarımı Araştırma Merkezi ve enstitü araştırma altyapısının iyileştirilmesi için Biyokütle ünitesi bina tadilatı yapılmış, biyogaz ve piroliz ünitelerinin kurulumları tamamlanmıştır
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tarımsal Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Artırılması projesi kapsamında eğitimler farklı konularda devam etmektedir.
- Rize ilinde uygulanması planlanan Gıda güvenliği ve Kontrol Sisteminin güçlendirilmesi Projesi, arsa durumuna göre tadilat yapılarak bu yıl içerisinde inşaat ihalesine çıkılması planlanmış, ancak inşaatın yapılacağı arazinin bir bölümü yol yapımı nedeniyle ikinci kez istimlak edildiğinden inşaat ihalesine çıkılamamıştır.
- Bölgenin bitkisel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi çerçevesinde yıllık olarak gerçekleştirilen,
 - ✓ DOKAP Bölgesi genelinde uygulanan Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi tamamlanmıştır.
 - ✓ Giresun ilinde uygulanan İyi Tarım Uygulamalı Fındık Ürünü Yetiştiriciliği Projesi tamamlanmıştır.
 - ✓ Ordu ilinde uygulanan Fındık Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi devam etmektedir.
 - ✓ Giresun ve Trabzon illerinde uygulanan Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Projesi (ÇATAK) Projesi devam etmektedir.
 - ✓ DOKAP Bölgesi genelinde uygulanan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi projesi tamamlanmıştır.
 - ✓ Artvin ve Bayburt illerinde uygulanan Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi devam etmektedir.
 - ✓ Artvin ilinde uygulanan Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi devam etmektedir.
- DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi çerçevesinde, Projenin yürütülebilmesi ve bölge tarımsal araştırma teknolojik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla saf su cihazı tedarik edilmiş olup, belirlenen 1.050 noktadan toplam 2.100 toprak örneği alınması işi için birinci ara rapor dönemi içerisinde hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
- DOKAP Çay Kalitesinin Geliştirilmesi Araştırma Projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile protokol imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir.
- Meraların ıslah ihtiyacı belirlenecek ve sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır.' eylemi kapsamında faaliyetler devam etmektedir.
 - ✓ Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde gübreleme, üstün tohumlama, yapay çayır mera tesisi, otlatma kolaylaştırıcı tesisler konularında faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
 - ✓ Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Mera Islahı projesinde, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun illerinde toplam 1.922 hektar alanda mera ıslah çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Potansiyelinin Araştırılması Projesi kapsamında, Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi envanterinin çıkarılabilmesi için gerekli verileri elde etmek üzere ziyareti planlanan kamu kurumları ile görüşmelere devam



edilmiş, DOKAP tarafından onaylanan danışmanlar ile “Tarımsal Üretim ve Tarıma Dayalı Sanayi Envanteri” çıkartılmıştır.

- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi eylemi çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nda DOKAP bölgesine 6,63 milyon TL destek sağlanmıştır.
- Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için İdaremiz tarafından Giresun, Gümüşhane ve Samsun illerinde Çiğ Süt Toplama Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi çalışmaları devam etmektedir.
- Hayvancılıkta örnek üretim sistemlerinin desteklenmesi kapsamında; İdaremiz tarafından Ordu ilinde Organik Yumurta Tavukçuluğunda Sertifikalı Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi, Doğu Karadeniz Serbest Sistem Yumurta Üretim Paketleme Tesisi Kurulumu Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Yumurta Tavukçuluğu Yem Ünitesi Projesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Yumurta Tavukçuluğunun Tanıtılması Projesi uygulanmıştır.



Samsun Tarımsal Altyapı



Çiğ Süt Toplama Tankı



Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Projesi



Hayvancılık Desteği



Yem Ünitesi Fabrikası



Çay Kalitesinin Geliştirilmesi Araştırma Projesi

- Arıcılığın desteklenmesi amacıyla, Arı ve Arı Ürünleri Üretimi Faaliyetlerinin DOKAP Bölgesinde Geliştirilerek Yaygınlaştırılması Projesi adı altında alt proje gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında; Ana Arı Üretimi, Arı Sütü Üretimi, Polen ve Propolis Üretimi, Oğul ve Kış Bakımı konularında 1.503 kişiye teorik ve pratik eğitimler verilmiştir. Ayrıca Arıcılık Altyapısının Desteklenmesi Programı kapsamında illere 1.547 bin TL ödenek aktarılmıştır. Rize ilinde ise DOKAP Bölgesi Arı Ürünleri Paketleme Tesisleri Modernizasyonu projesi, Rize İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile imzalanmış protokol gereğince ihale işlemleri tamamlanmış kesin kabul işlemi yapılmıştır.



- Su ürünleri sektörünün geliştirilmesi için 2016 yılında Trabzon ilinde Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi projesi altında 14 alt projede ar-ge faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası Projesinde inşaat faaliyetleri devam etmektedir.
- Soğuk hava depolama kapasitesinin artırılması kapsamında İdaremiz, Ordu ilinin Altınordu ilçesinde 550 ton kapasiteye sahip soğuk hava deposu inşaatları için ilgili kurumlar ile protokol imzalamış olup projenin 2017 Mart ayında tamamlanması planlanmaktadır.
- 'Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılacaktır.' eylemi kapsamında yürütülen Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa'nın Kurulması Projesi çalışmaları tamamlanarak Fındık Borsası hizmete açılmıştır.
- Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin sağlanabilmesi için; Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında 6.407 hektar alanda ağaçlandırma, 1.897 hektar alanda rehabilitasyon, 5.171 hektar alanda erozyon kontrolü faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 25.250 adet fidan üretilmiştir. Ayrıca Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Artvin ve Bayburt illerinde 1.942 hektar alanda rehabilitasyon, 2.826 hektar alanda erozyon kontrolü faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- Tıbbi aromatik bitkilerin envanteri çıkarılacak ve ticari kullanım potansiyellerinin araştırılması eylemi için İdaremiz tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Envanterinin çıkarılması, Ticari kullanımının Araştırılması Üreticilerin Eğitimi Projesi uygulanmaktadır. Proje kapsamında 2015 yılında toplanan bitki örneklerinin teşhisleri yapılarak İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (ISTE) herbaryumunda kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Şu ana kadar Artvin, Bayburt, Giresun ve Gümüşhane illerinde toplanan bitki örnekleri yer, tarih, yükseklik bilgileri ISTE bilgi sistemi kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Ayrıca bu illerin sınırları içerisinde yapılmış olan floristik çalışmalar ve etnobotanik makaleler derlenmiştir. Bu çalışmalardaki bitkilerde ana listeye eklenmiştir. Arazi çalışmaları için bölgeyi iyi tanıyan yerel kişilerle ve özellikle arıcılık faaliyeti yürüten yöre halkıyla bağlantıya geçilmiştir.



Arı Ürünleri Paketleme Tesisi



Trabzon-Gen Merkezi



Giresun Fındık Borsası

Ordu
Soğuk Hava Deposu

Tıbbi Aromatik



Arıcılık Eğitim




Sanayi, Girişimcilik ve Ar-Ge

- İşletmelerarası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında, DOKA tarafından Kümelenme ile ilgili çalıştaylar yapılarak Eylem Planı çıkarıldı ve sektörler belirlendi. AB fonlu Gümüşhane İŞGEM projesi yürütülmekte olup Trabzon için de çalışmalar devam etmektedir.
- Bölge ihracatının artırılması için Ekonomi Bakanlığı tarafından DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kapsamında DOKAP Bölgesi illerine toplam 76,6 milyon TL destek sağlanmıştır. Ayrıca Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenmiş, düzenlenen seminerlere 296 katılımcı iştirak etmiştir.
- DOKAP Bölgesi'nde yer alan sınır kapılarının güçlendirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.
 - ✓ **Sarp Sınır Kapısı:** Sarp Gümrük Kapısı: "Sarp Gümrük Kapısı Yeni Hizmet Binaları, Ticari Tesisler ile Mütemmimlerinin Yapım İşi" ile ilgili olarak kamulaştırma ve proje çalışmaları tamamlanarak söz konusu işin ihalesi yapılmış olup bu kapsamda çalışmalara başlanılmıştır
 - ✓ **Muratlı Sınır Kapısı:** Planlanan gümrük sahası içerisinde kalan ve taşınmasına karar verilen karakol binasının taşınacağı alan ile ilgili olarak kamulaştırmaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
- Orman ürünlerine yönelik sanayinin desteklenmesine yönelik, DOKA tarafından Ormanlık Sektör Raporu ve Mobilya Sektör Raporu oluşturulmuştur.
- KOSGEB uyguladığı destek programları ile 2016 yılında DOKAP İllerinde 1.777 işletmeye 24,36 milyon TL destek sağlamıştır.
- **“Organize sanayi bölgesi projeleri tamamlanacaktır.”** eylemi kapsamında,
 - ✓ Bayburt OSB Enerji Nakil Hattı Kamulaştırma işlemleri için projenin I. Etap (100 hektar noksan kalan işler+30 hektar) alana ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi ihalesi yapılmıştır.
 - ✓ 49 hektar büyüklüğündeki Giresun (Bulancak) OSB projesinin yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve Telekom altyapı inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi ihalesi yapılmıştır.
 - ✓ 50 hektar büyüklüğündeki Rize OSB projesinin altyapı yapım inşaatı fiziki gerçekleşme oranı % 97 seviyesinde devam etmekte olup, Telekom ve AG-YG elektrik şebekesi inşaatı tamamlanmıştır.
 - ✓ 97 hektar büyüklüğündeki Samsun Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas OSB projesinin altyapı ikmal yapım inşaatı ve AG-YG Elektrik Şebekesi ve Enerji Nakil Hattı yapım işi inşaatı tamamlanmıştır.
 - ✓ 89 hektar büyüklüğündeki Şinik (Akçaabat) OSB projesinin AG-YG elektrik şebekesi inşaatı tamamlanmış olup, altyapı yapım inşaatı fiziki gerçekleşme oranı % 79 seviyesinde devam etmektedir.
 - ✓ Trabzon Beşikdüzü OSB ve Trabzon Vakfıkebir OSB projelerinin imar planı çalışmaları devam etmektedir.
- **“Küçük sanayi sitesi projeleri tamamlanacaktır.”** eylemi kapsamında,
 - ✓ 63 işyerilik Ordu Aybastı KSS'nin mimari proje çalışmaları devam etmektedir.
 - ✓ 200 işyerilik Rize Modern KSS projesinin 98 işyerine ait üstyapı ikmal inşaat fiziki gerçekleşme oranı % 58 seviyesinde devam etmekte olup, yol, içmesuyu, atıksu,

yağmursuyu ve YG-AG elektrik şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi inşaatı devam etmektedir.

- ✓ 71 işyerilik Pazar Modern KSS projesinin üstyapı inşaat fiziki gerçekleşme oranı % 59 seviyesinde devam etmektedir.
- ✓ 20 işyerilik Artvin-Şavşat Sahara KSS 2016 yılı Yatırım Programına "20 işyeri %70 Krd. Altyapı" karakteristiği ile yeni proje olarak dahil edilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.
- Bölge tersanelerinin gelişiminin desteklenmesi amacıyla, TSO tarafından bölgenin tek tersanesi olan Trabzon Çamburnu Tersanesinde faaliyet gösteren şirketler için AB projesi yürütülmekte olup DOKA tarafından projeye teknik destek sağlanmaktadır. Sektör, başlangıç/gelişen küme aşamasındadır.
- DOKAP Bölgesi'nin Ar-Ge, teknoloji ve yenilik kapasitesinin artırılması çalışmaları sürdürülmektedir.
 - ✓ Bayburt Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Merkezi Araştırma Laboratuvar projeleri devam etmektedir.
 - ✓ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri yıllık olarak devam etmektedir.

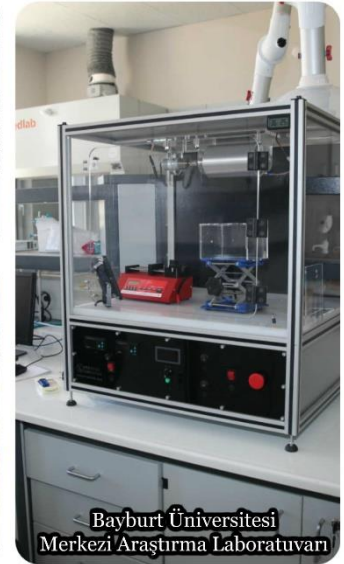



- *Büyük ölçekli yatırımları çekmek amacıyla Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından, Türkiye'nin yatırım ortamının tanıtılması faaliyetlerinde, özellikle DOKAP Bölgesi İllerimize yönelik teşvik, işgücü maliyeti ve diğer avantajlar potansiyel yatırımcılara vurgulanmaktadır.*
- *“Yöresel ürünler tespit edilecek ve coğrafi işaretleri alınacaktır.” eylemi kapsamında DOKA tarafından Yöresel ürün eylem planı oluşturulmuştur. Çalışmada yöresel ürün tescilinin faydalı olacağı ürünler üzerine yoğunlaşmıştır. Envanter çalışmalarına başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.*

Madencilik

- *“Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve ekonomiye kazandırılacaktır.” eylemi kapsamında; Doğu Karadeniz Metalik Maden Aramaları, Doğu Karadeniz Yay Magmatikleri İle İlişkili Polimetal Maden Aramaları, Ordu İli ve Çevresi Bentonit Aramaları ve Trabzon- Rize- Artvin Ruhsat Etütleri projeleri gerçekleştirilmiştir.*





3.4.3. Altyapı ve Kentsel Gelişme

Ulaştırma ve Bilgi İletişim

- *Havayolu altyapısının geliştirilmesi kapsamında;*
 - ✓ *Trabzon Hv. Şerit Sahalarının Düzenlenmesi ve Dönüş Cebinin Standart Hale Getirilmesi ve Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminal Binası Gidiş Salonu Tadilatı devam etmektedir.*
 - ✓ *Samsun Havalimanı Mevcut İtfaiye Binasına Aks İlavesi Yapılması ve Samsun Çarşamba Hv. PAT Sahaları Onarım çalışmaları devam etmektedir.*
 - ✓ *Artvin-Rize Havalimanı için Deniz Sondajı ve Jeoteknik Rapor Hazırlanması işi tamamlanmış ve 2016 Yılı Kamu Yatırım Programına alınmıştır. 2017 yılının ilk çeyreğinde yer teslimi yapılacak olup Mart-Nisan aylarında temeli atılabilecektir.*
- **“Demiryolu altyapısı iyileştirilecek ve yeni demiryolu ağları için fizibilite çalışmaları yapılacaktır.”** eylemi kapsamında, Samsun - Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu ve Samsun ilindeki muhtelif işler devam etmektedir.





- Bölgenin karayolu ulaşım altyapısının iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda; Samsun-Yakakent, Samsun Şehir Geçişi, Alaçam-Kızlan-Çerçiler, Rize-Pehlivantaş-Kalkandere, Gündoğdu-Veliköy, Buzlupınar Ahşap Köprüsü ve Trabzon Şehir Geçişi (Kanuni Bulvarı) projeleri tamamlanarak, DOKAP Bölgesi'nin 4.915 km. olan yol ağı 4.978 km olmuştur. Diğer yol projeleri devam etmektedir.



Yakakent-Gerze



Ordu Çevreyolu



Bolaman Köprüleri



Gümüşhane-Bayburt Ayrım Kelkit-Şiran



Bayburt-Köse Yolu



Ünye Çevre Yolu

- Bölgenin kuzey-güney ulaşım bağlantılarını sağlayan yolların tamamlanması amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda;
 - ✓ **Hopa-Borçka (Cankurtaran Tüneli Geçişi Dâhil):** Cankurtaran tünelin sol tüpünde bulunan 4 adet trafo binasının inşaatı ile sağ tüpteki trafo binalarının inşaatı devam etmektedir. 92 adet jet fandan sol tüpteki 46 adet jet fan yerine takılmıştır. (%85 fiziki gerçekleşme)
 - ✓ **Eğribel Tüneli:** Eğribel Tünelinde Şebinkarahisar ilçesi yönünde 4735 m. Dereli İlçesi yönünde 443 m. olmak üzere bu güne kadar her iki tüpte toplam 5.180 m kazı çalışması tamamlanmıştır. (%6 fiziki gerçekleşme)
 - ✓ **Ordu-Mesudiye-Koyulhisar:** Üç ayrı kesimdeki heyelan ıslahı çalışmaları tamamlanmış ve bu kesimlerin üstyapı işleri de bitirilerek trafiğe açılmıştır. (%86 fiziki gerçekleşme)
 - ✓ **İkizdere-İspir Yolu Ovit Tüneli:** 12,6 Km. lik tünelin sol tüpünde kazı çalışması İkizdere tarafından 5.285 metre İspir tarafından 7.351 metre ilerlenerek birleştirme gerçekleştirilmiştir.. Sağ tüpte ise İkizdere tarafından 5.256 metre İspir tarafından 7.371 metre ilerlenerek birleştirme gerçekleştirilmiştir... Tünelde 2x10,035 m nihai beton kaplama yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. 1.700 m Yaklaşım

tünelinde 801 m kazı imalatı ve 2 x 1,369 m'lik Aç-Kapa Tünelinde de 2 x 636 m Kemer betonu kaplaması tamamlanmıştır.

- ✓ 48,5 km uzunluğundaki Samsun-Kavak yolunun 2016 yılı içerisinde 29 Km lik kesimde aşınma tabakası tamamlanmıştır.



- Bölgedeki balıkçı barınaklarının fiziki altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında Arsin, ve Gündoğdu balıkçı barınaklarını inşaatları tamamlanmıştır. Hopa Balıkçı Barınağı İnşaatı ise %17 seviyesinde devam etmektedir.
- **HaberleşmeNET Projesi:** Kalkınma Bakanlığı, kablosuz ücretsiz internet erişim hizmetini pilot proje kapsamında gerçekleştirilmesini ve pilot proje sonunda elde edilecek olan çıktılara göre projenin kapsamının genişletilip genişletilmemesinin karar verilmesini önermiştir. Bu çerçevede DOKAP kapsamında yer alan illerden Ordu, pilot il olarak seçilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, Kablosuz ücretsiz internet erişim hizmetinin teminine yönelik ihaleye çıkabilmesini teminen bütçe tahsisi beklenmektedir.



Tarımsal ve Kırsal Altyapı

- “Bölgede devam eden büyük su işleri hızlandırılarak sulama altyapısı geliştirilecektir.” eylemi kapsamında;
 - ✓ **Samsun-19 Mayıs Barajı(DOKAP):** %85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Sulama inşaatının proje çalışmaları devam etmektedir.
 - ✓ **Aydıntepe-Çayıryolu II. Merhale (DOKAP):** Demirözü Sulaması işinde 2500 ha alan sulamaya açılmıştır. İşin genel fiziki gerçekleşmesi % 95 seviyesine ulaşmıştır.
 - ✓ **Bafra Ovası Sulaması Projesi:** Toplulaştırılması tamamlanan 80.000 dekarlık zirai arazi sulamaya açılmıştır. Proje kapsamında toplam 40,7 km S1 ana kanalı trapez kaplama ve duvarlı kanal imalatı, 26,9 km yedek kanal, 482,6 km drenaj kanalı, 415 km kanalet montajı tamamlanmıştır.
 - ✓ **Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi:** %23 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Çarşamba Ovası Sağ Sahil Sulaması 1.Kısım İkmali, Drenaj inşaatlarının tamamlanmasından sonra ihale edilecektir.
 - ✓ **Yukarı Kelkit (DOKAP) (Sadak Barajı ve Sulaması):** Sadak Barajı Sulaması işinde çalışmalar devam etmekte olup 2016 yıl sonu itibariyle %28 fiziki gerçekleşme elde edilmiştir.
 - ✓ **Vezirköprü Projesi:** %35 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı sorumluluğundaki, küçük sulama işleri kapsamında altyapı hizmetleri bölge genelinde devam etmektedir.



Bayburt-Merkez Taht Köyü İkmali



Çoruh Park



Bayburt-Merkez Uğrak Göleti



Bafra Ovası Sulaması



Sadak Barajı ve Sulaması



- *Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi kapsamında Artvin İlinde 3 projenin imalat çalışması tamamlanmış olup Artvin ve Bayburt İllerindeki diğer projelerin imalat çalışması devam etmektedir.*
- *Bölge'de ıslah ve taşkın koruma faaliyetleri Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, DOKAP illerinde devam etmektedir.*




- *Bayburt ve Samsun illerinde 4 proje kapsamında 69 yerleşim biriminde 70.000 ha alanda arazi toplulaştırma çalışmaları planlanmış olup 19.000 ha alanın toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Projeler kapsamında 51.000 ha alanda çalışmalar devam etmektedir.*
- *6682 sayılı 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10. maddesinde belirtilen KÖYDES Projesi kapsamında, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize illerine aktarılan ödenekler ile kırsal altyapı sorunlarının giderilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.*



Enerji

- Bölgenin enerji üretim altyapısının iyileştirilmesi kapsamında Deriner Barajı tamamlanmıştır. Yusufeli Barajı ve HES projesinde, Derivasyon tüneli, menba ve mansap batardoları, kırma eleme tesisi, baraj içi ulaşım yolları, şalt sahası platformunun oluşturulması ve şev duvarları imalatları, kret üstü kazı ve destekleme çalışmaları, kablolu vinç platformu oluşturulması, kablolu vinç hattının montajı, santral binası ve transformatör salonu tavan kemer betonları ile santral binası kazısı tamamlanmıştır. (%60 fiziki gerçekleşme)
- Bölgenin enerji dağıtım altyapısının iyileştirilmesi kapsamında Ardanuç Havza TM, (Artvin - Ardahan) Brş. N. - Ardanuç EİH, Çamoluk Havza TM Tevsiat, Gümüşhane-Torul EİH, Ordu -Reşadiye EİH, Ordu 380 TM, Ordu 380 TM İrtibat Hatları, Akkuş Havza - Umut HES EİH, Darıca-1 HES TM Tevsiat ve Akyazı TM inşaatları tamamlanmıştır. Elektrik iletim hatlarının iyileştirilmesine devam edilmektedir.
- Artvin DGBH yapım işi ihalesine 2017 yılı içerisinde çıkılması planlanmaktadır.

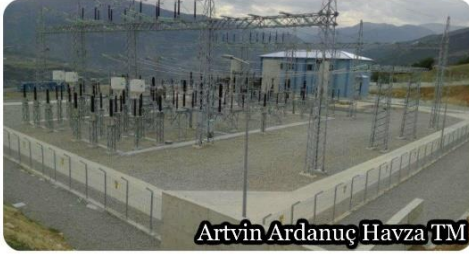

Artvin Ardanuç Havza TM



Deriner Barajı



Giresun Bulancak-Kovanlık Havza TM



Yusufeli Barajı



Trabzon Akyazı TM



Kentsel Gelişme

- *Yusufeli İlesi Yeniden Yerleşim inşaat sahasında yükleniciye ait makine parkı marifetiyle patlatmalı kazı ve dolgu imalatları devam etmektedir. Bugüne kadar toplamda 7.700.000 m³'lük kazı ve 4.200.000 m³'lük dolgu imalatı yapılmıştır.*
- *Bölgede kanalizasyon ve içme suyu altyapıları ile arıtma sistemleri projeleri devam etmektedir.*
- *Katı Atık Bertarafı için Düzenli Depolama Alanlarının Araştırılması Projesi kapsamında Uygulayıcı Kuruluş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi ile protokol imzalanarak çalışmalara başlanmış olup, proje kapsamında Kompostlaştırma ile ilgili ayrı bir analiz yapılmaktadır. Ordu ve Samsun illerinde belirlenen düzenli depolama alanlarının sondaj işlemleri tamamlanmıştır. Çevresel analiz çalışmaları devam etmektedir.*



Ordu Kanalizasyon ve İçme Suyu Projesi



Trabzon İmesuyu Projesi



Trabzon İmesuyu İsale Hattı



Yusufeli İlesi Yeniden Yerleşim Yeri



3.4.4. Sosyal Gelişme

Eğitim

- “Okulöncesi eğitimde fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranı artırılabilecektir.” eylemi kapsamında Artvin ve Samsun illerinde Anaokulu inşaatları devam etmekte olup 2016 yılında okul öncesi eğitimde 49 derslik hizmete açılmıştır. Ayrıca Okul Öncesi Öğretim Kurumları Altyapı İyileştirme Ödeneği kapsamında DOKAP İllerine 4,3 milyon TL ödenek aktarılmıştır.
- İlköğretim ve ortaöğretimde fiziki altyapının iyileştirilmesi, okullaşma oranının artırılması, derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması ve mevcut okullar bünyesinde zenginleştirilmiş kütüphaneler oluşturulması için 2016 yılında 157,4 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda DOKAP Bölgesi'nde; ilköğretimde 546, ortaöğretimde 44, mesleki ve teknik eğitimde 124, dini eğitimde 271 derslik ve 2.800 kişilik pansiyon hizmete açılmış ve 35 okula z-kütüphane desteği gönderilmiştir.
- Okulların açık ve kapalı spor salonlarının tamamlanabilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2016 yılında 2,3 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 11 spor salonu, 3 konferans salonu hizmete açılmıştır.
- Bölgenin yükseköğretim altyapısının geliştirilmesi amacıyla, DOKAP Bölgesi üniversitelerine 2016 yılında toplam 302,2 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenegin yilsonu itibariyle 234,8 milyon TL'si harcanmıştır.



OMÜ-Kütüphane



KTÜ-Dış Hekimliği Fakültesi



RTE-İİBF ve Hukuk Fakültesi



Artvin Çoruh Üniversitesi-Kütüphane İnşaatı

Giresun Üniversitesi
Güzel Sanatlar FakültesiGümüşhane Üniversitesi
Açık Hava Amfi

Bayburt Üniversitesi- İlahiyat Fakültesi



Ordu Üniversitesi-Ziraat Fakültesi



- Bölgenin yükseköğretim yurt kapasitesinin artırılması için projeler devam etmektedir.
- Artvin, Bayburt, Giresun ve Gümüşhane illerinde işgücünün istihdam edilebilirliğini ve mevcut çalışanların niteliğini artıracak Halk Eğitim Merkezi inşaatları devam etmektedir.

Sağlık

- Bölgede koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında 175 adet acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. İstasyonlara gerekli ekipmanların sağlanabilmesi için 2016 yılında 12,5 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.
- Bölgenin sağlık alanındaki fiziki altyapısının geliştirilmesi için 2016 yılında;
 - ✓ Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (150 Yatak), Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (40 Ünit + 5-6 Hekimlik ASM), Samsun Terme Devlet Hastanesi (100 yatak) ve Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (60 Ünit) inşaatları tamamlanmıştır.



Trabzon Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Samsun
Terme Devlet Hastanesi



Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi



Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi



Ordu-Fatsa Devlet Hastanesi



Ordu-Kumru Devlet Hastanesi



- ✓ *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatına ilişkin yapım işleri devam etmektedir.*
- ✓ *Ondokuz Mayıs Üniversitesi muhtelif işler projesi kapsamında 19 kalem tıbbi malzeme satın alımı gerçekleştirilmiştir.*
- ✓ *Karadeniz Teknik Üniversitesi 300 yataklı çocuk hastanesi inşaatı devam etmektedir.*
- ✓ *Karadeniz Teknik Üniversitesi muhtelif işler projesi kapsamında başhekimlik ve ameliyathane inşaatları tamamlanmış ve tıbbi cihaz alımı gerçekleştirilmiştir.*



OMÜ-Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi



KTÜ-Çocuk Hastanesi



OMÜ-Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



KTÜ-Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi

- *Bölge sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline getirilmesi amacıyla DOKA tarafından, Ordu ilinde 'Ordu Sağlık Turizmi İle Bir Adım Önde', Trabzon ilinde 'Trabzon Sağlık Turizmi Bilgilendirme Eğitimi' gerçekleştirilmiştir.*



Sosyal Hizmet ve Destekler

- Artvin-Merkez, Bayburt-Merkez, Gümüşhane-Merkez, Rize-Merkez ve Samsun-Merkez sosyal hizmet merkezleri inşaatı devam etmektedir.
- 30 kişi kapasiteli Trabzon Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon merkezi hizmete açılmıştır.
- Giresun, Gümüşhane ve Samsun illerindeki Engelsiz Yaşam Merkezlerinin inşaatı devam etmektedir.
- 'Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliği artırılacaktır.' eylemi kapsamında; Filli Kadın Ustalar Projesi, Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi uygulanmaktadır.
- DOKA tarafından sorumlu olduğu illeri kapsayan Sosyal Analiz Çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Giresun Görele Gençlik Merkezi, Gümüşhane Merkez Gençlik Merkezi ve Trabzon Of Gençlik Merkezi inşaatları tamamlanmıştır. Bölgedeki yapımı devam eden 17 gençlik merkezinde çalışmalar yürütülmektedir.



Artvin-Arhavi Gençlik Merkezi



Ordu Ünye Gençlik Merkezi



Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi



Samsun İlkadım Gençlik Merkezi



Giresun Görele Gençlik Merkezi



Trabzon Çocuk Evleri Sitesi



Kültür ve Spor

- *DOKAP Bölgesi'nin kültür envanterinin çıkarılması için Başkanlığımız tarafından danışmanlık, kontrolörlük ve müşavirlik kısmının ihalesi yapılmıştır.*
- *Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve restorasyon işleri kapsamında, 71 adet işin sözleşmesi yapılarak işe başlanılmış, 50 adet iş tamamlanmış, 21 adet iş devam etmektedir.*
- *Bayburt Etnografya Müzesi (Kavallar Evi) ve Gümüşhane Etnografya Müzesi (Kavallar Evi) projelerinin ihaleleri yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.*
- *Kültür hizmetlerine erişimin artırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde çalışmalar devam etmektedir.*



Rize Çayeli Hacıbaşı Camii



Trabzon Ortahisar Konaklar Mah. Camii



Artvin Arhavi Ulukent Köyü Camii



Trabzon Ortahisar Erdoğan Tahtalı Camii



- *Artvin Güreş Antrenman Salonu, Gümüşhane Şiran Spor Salonu, Samsun Ladik 2.000 Seyircili Güreş Alanı, Samsun Terme Futbol Sahası, Trabzon Düzköy Spor Salonu ve Trabzon Judo Antrenman Spor Salonu projeleri tamamlanmıştır.*



Trabzon Judo Antrenman Spor Salonu



Samsun Okçuluk ve Bowling Salonu

Rize Merkez
Sporcu Fabrikası

Gümüşhane Torul Açık Saha



Bayburt Aydıntepe Spor Salonu



Artvin Kapalı Yüzme Havuzu



Gümüşhane Kapalı Yüzme Havuzu

3.4.5. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

*Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde sadece “**KK 2.6: Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesi desteklenecektir.**” eylemi kapsamında DOKA tarafından Gümüşhane Belediyesi'nin "e-Beyaz Masa" ile Ordu B. Belediyesi'nin "Ordu Altyapı Koordinasyon Sistemi" adlı DFD Projeleri desteklenmiştir.*
